


LAPORAN STATUS KERJA UKUR
BAHAGIAN UKUR TANAH
CAWANGAN KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN
(PELAKSANAAN KERJA
PENGUKURAN SECARA IN-HOUSE
DAN LANTIKAN PERUNDING 2019)

PENGUKURAN SECARA IN HOUSE

- 1) Kemukakan Permohonan Ukur (PU) kepada Bahagian Ukur Tanah (BUT) beserta skop kerja yang mengandungi maklumat berikut :
 - Pelan Akui (bagi lot yang telah mempunyai hakmilik kekal) atau Geran hakmilik sementara.
 - Pelan Pra Hitungan yang lengkap dan telah mendapat kelulusan / pengesahan.
 - Nyatakan jarak koridor daripada sempadan lot yang diperlukan.
 - Lain-lain keperluan yang dinyatakan. Cth butiran pokok memerlukan saiz minimum ukur lilit.
- 2) Penyediaan anggaran kos dan perancangan kerja pengukuran
- 3) Pelaksanaan kerja ukur
- 4) Penyediaan Pelan Butiran
- 5) Semak/Verifikasi Data (Dilapangan)
- 6) Kemukakan Pelan Butiran kepada pelanggan

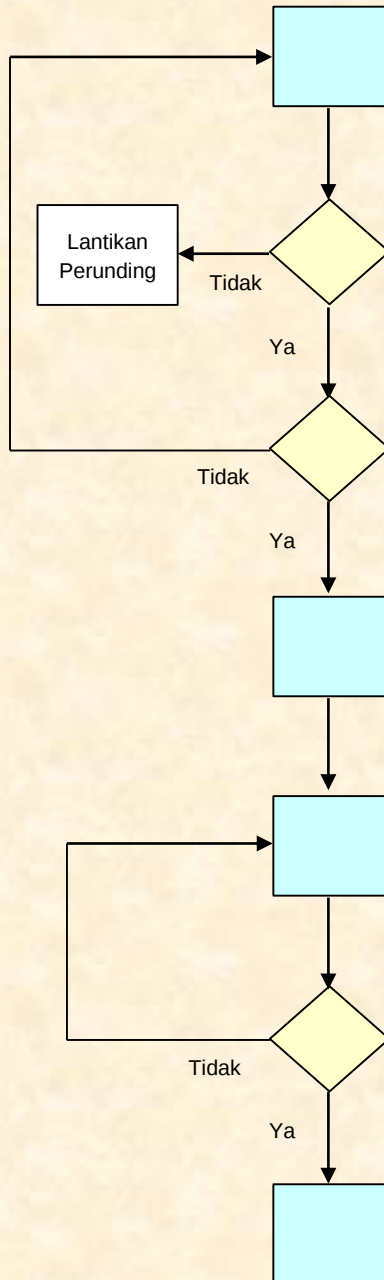

- Terima surat permohonan ukur.
- Penilaian sama ada kerja ukur dilaksanakan oleh jabatan atau tidak (jika tidak, perlu lantikan perunding).
- Permohonan ukur lengkap atau tidak lengkap
- Membuka dan daftar fail
- Merancang pelaksanaan kerja ukur dan mengumpul maklumat yang diperlukan.
- Pelaksanaan kerja ukur mengikut perancangan dan peraturan yang ditetapkan.
- Melaksanakan kerja hitungan.
- Penyediaan lukisan pelan ukur mengikut format.
- Semak lukisan pelan ukur mengikut format atau tidak.
- Semak data ukuran berdigit yang dikemukakan teratur
- Segala data ukur berdigit termasuk data cerapan dan data pelan ukur hendaklah di '*backup*' ke dalam media storan dalam cakera padat atau cakera liut.
- Memperakukan data ukur berdigit dan pelan ukur.

PENGUKURAN SECARA LANTIKAN PERUNDING

Kaedah pelantikan perunding bagi Ukur Tanah terbahagi kepada dua (2) jenis iaitu :


- Lantikan Terus Beserta Kos Siling (Kos Siling RM500k ke bawah)
 - Kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga Cawangan

- Tender Terhad
 - Kos Siling > RM 500 ribu -2 juta, Kelulusan Lembaga Perolehan 'B'
 - Kos Siling > RM 2 juta – 5 juta, Kelulusan Lembaga Perolehan 'A'
 - Kos Siling > RM 5 juta – 200 juta, Kelulusan Kementerian Kewangan (MOF)

Kaedah Lantikan Terus Beserta Kos Siling (LTBKS).

1. Kemukakan Permohonan Ukur (PU) kepada Bahagian Ukur Tanah (BUT) beserta skop kerja yang mengandungi maklumat berikut :
 - Pelan Akui (bagi lot yang telah mempunyai hakmilik kekal) atau Geran hakmilik sementara.
 - Pelan Pra Hitungan yang lengkap dan telah mendapat kelulusan / pengesahan.
 - Nyatakan jarak koridor daripada sempadan lot yang diperlukan.
 - Lain-lain keperluan yang dinyatakan. Cth : butiran pokok memerlukan saiz minimum ukur lilit.
2. Pihak HOPT perlu mendaftarkan Projek dalam ePerunding dan kemukakan maklumat pendaftaran kepada pihak BUT.
3. Penyediaan anggaran kos siling, Term of Reference (TOR) dan penilaian teknikal perunding bagi pengesyoran 3 nama perunding oleh BUT.
4. Anggaran Kos Siling, TOR dan pengesyoran 3 nama perunding oleh BUT dibawa ke Jawatankuasa Pelantikan Perunding (JPP) Cawangan berkenaan oleh Urusetia JPP Cawangan berkenaan untuk kelulusan.
5. Minit Mesyuarat JPP dikemukakan kepada BUT untuk dikemaskini dalam sistem ePerunding .
6. Penyediaan pengesyoran senarai nama perunding oleh BUT untuk persediaan Pihak Berkuasa Melulus (PBM) Cawangan.
7. Senarai nama perunding yang disyorkan dibawa oleh Urusetia JPP Cawangan berkenaan ke PBM untuk kelulusan.
8. Minit Mesyuarat PBM kelulusan nama perunding dikemukakan kepada BUT untuk kemaskini.
9. Penyediaan Surat Pelawaan dan Dokumen Pelawaan oleh HOPT dan dikemukakan kepada perunding yang berjaya.
10. Penyediaan Cadangan Teknikal dan Kewangan (CTK) oleh perunding dalam tempoh 14 hari (bergantung kepada HOPT).

11. Semakan CTK perunding oleh BUT dan cadangan kos muktamad disyorkan untuk kelulusan mesyuarat JPP Cawangan.
12. Cadangan Muktamad CTK dibawa ke JPP Cawangan oleh Urusetia JPP Cawangan berkenaan untuk kelulusan.
13. Minit Mesyuarat JPP muktamad CTK diedarkan oleh urusetia.
14. Penyediaan Surat Setuju Terima (SST) beserta kos muktamad oleh HOPT dan dikemukakan kepada pihak perunding.
15. Penyediaan Deraf Memorandum of Agreement (MOA) oleh BUT dan dikemukakan kepada HOPT untuk kemaskini dan semakan.
16. Memorandum of Agreement (MOA) diserahkan kepada perunding.
17. Perunding melaksanakan kerja dilapangan.
18. Perunding mengemukakan pelan ukur beserta tuntutan bayaran (inbois) kepada HOPT.
19. HOPT menyerahkan dokumen tuntutan bayaran perunding beserta ulasan kerja siap kepada BUT untuk pengesyoran tuntutan bayaran perunding.
20. BUT menyediakan pengesyoran bayaran dan dikemukakan kepada HOPT.
21. HOPT memperakukan tuntutan bayaran perunding dan kemukakan kepada Bahagian Kewangan.

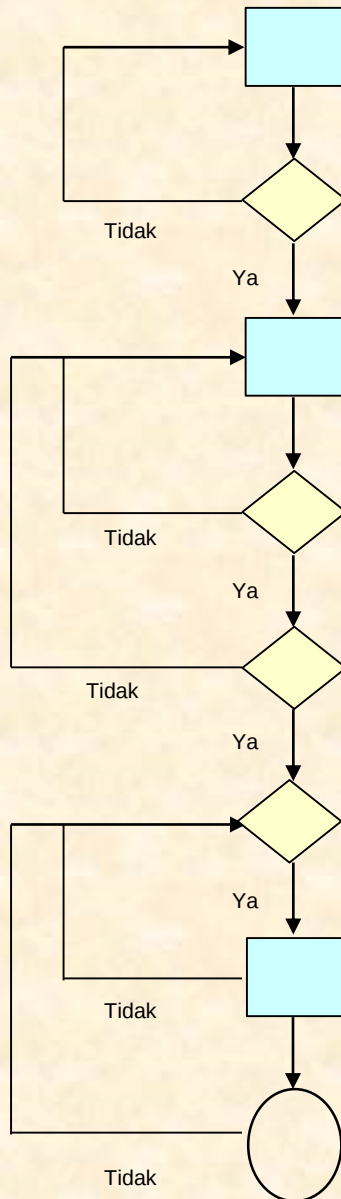

- Terima surat permohonan pelantikan perkhidmatan perunding.

- Permohonan pelantikan perkhidmatan perunding lengkap atau tidak dan telah didaftarkan dalam sistem ePerunding.

- Buka fail
- Kod Kawasan / Negeri / Cawangan
- Buka Fail Kulit Keras (AM 435 – Pin. 1/80)
- Sediakan *Term of Reference (TOR)*
- Sediakan anggaran kos perunding
- Penilaian Teknikal Perunding bagi pengesyoran nama perunding
- Semak *TOR*, Anggaran Kos Perkhidmatan Perunding beserta maklumat berkaitan.

14 hari

- Mesyuarat Jawatankuasa Pelantikan Perunding/Minit JPP
- Permohonan kelulusan *TOR*, Anggaran Kos dan Pengesyoran 3 nama perunding


1 hari

- Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)/PBM

1 hari

- Keluarkan Surat Pelawaan (SP)

1 hari

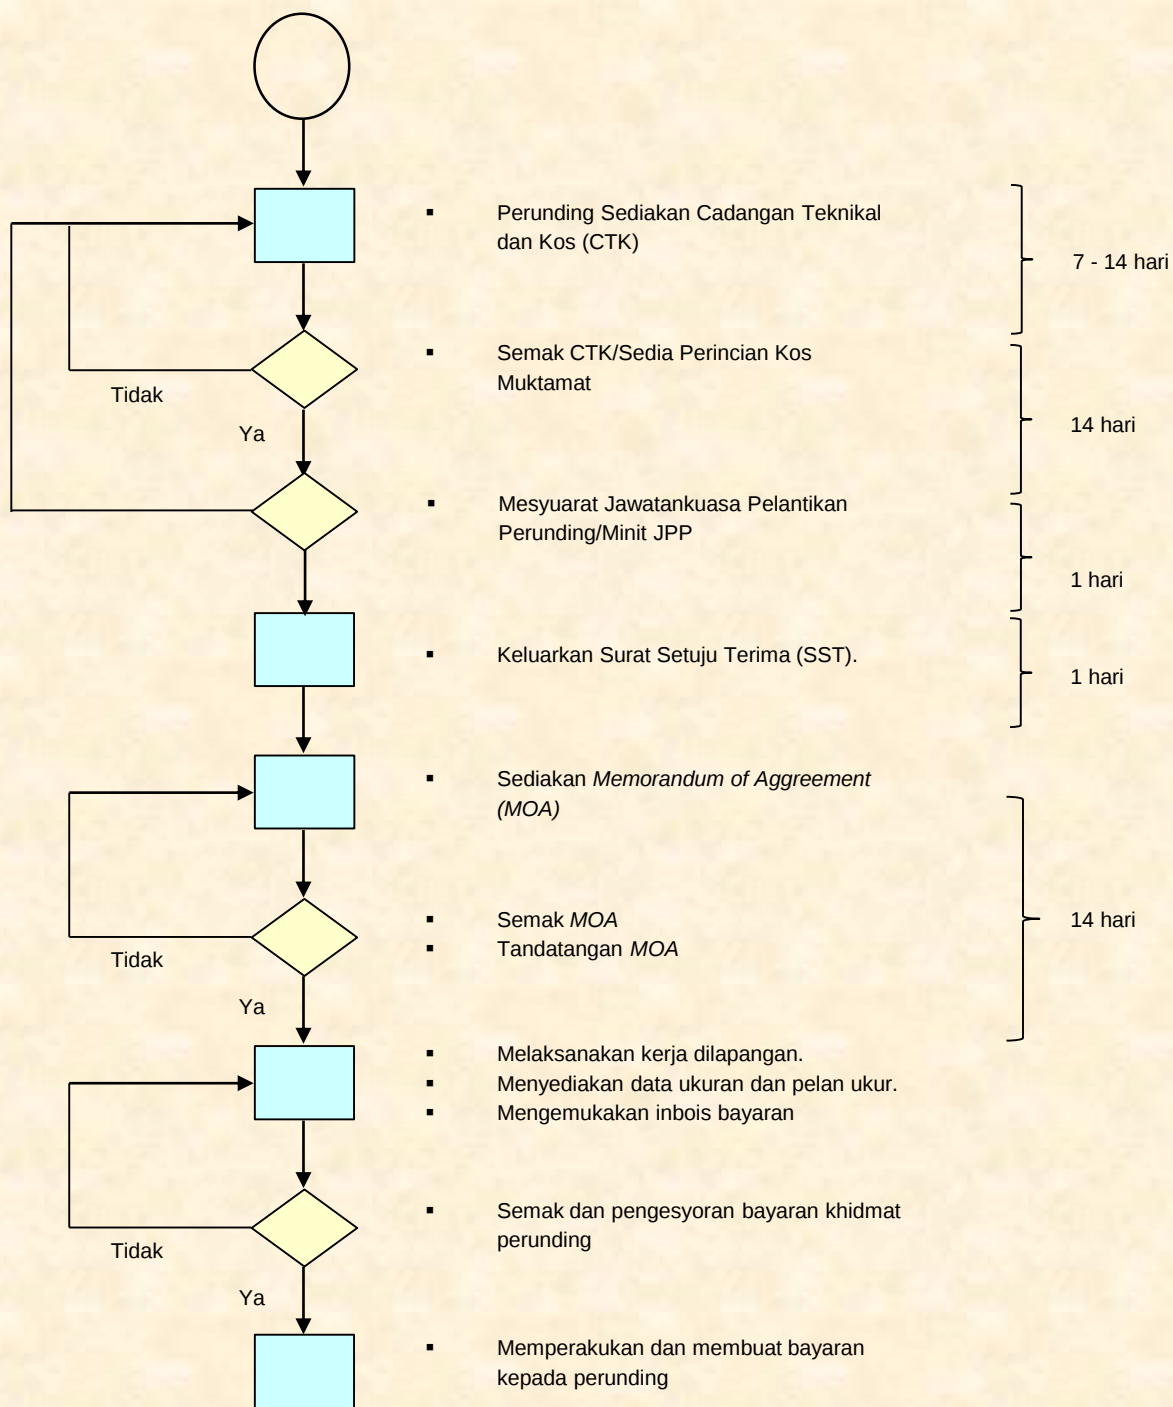

JADUAL KEDUDUKAN FAIL PERMOHONAN UKUR IN-HOUSE 2019

PERMOHONAN UKUR IN-HOUSE 2019 (LAPORAN SEHINGGA 19 MAC 2019)									
BIL	CAWANGAN PEMOHON	PROJEK	TARIKH TERIMA PERMOHONAN	PENGUKURAN SECARA DALAMAN	UNIT UKUR WILAYAH	MULA UKUR	SIAP UKUR	TARIKH HANTAR	CATATAN
1	CKIP	PROJEK LANDASAN KERETAPI DAN JEJAMBAT DI PEMBANGUNAN PERLIS INLAND PORT (PIP) DI LEMBAH CHUPING	24-Jan-19	/	GABUNGAN WILAYAH	21/1/2019			UKURAN PADANG
2		REMEDIAL WORKS AND MAINTENANCE OF 18 UNITS KTMB'S STAFF QUARTERS AND STATION AT KTMB CHEGAR PERAH STATION, KELANTAN-Permohonan Ukur Semula Aras Rel dan Kawasan Sekitar Stesen	27-Dec-18	/	TENGAH	7/1/2019	13/1/19	14/2/19	SIAP PLAN
3		PROJEK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR BAGI PESAWAT HELIKOPTER DI PANGKALAN UDARA: PAKEJ 1 PANGKALAN UDARA TUDM KUANTAN, PAHANG (TENDER SEMULA)	15-Jan-19	/	TIMUR	9/2/2019	10/2/2019		SEMAKAN PLAN
4	CKBA1	PEMBIAAN BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN KOTA BHARU, TUNJONG, KELANTAN	20-Feb-19	/	TIMUR	6/3/2019			UKURAN PADANG
5		MENAIKTARAF PUSAT KOMUNITI BERSEPADU, SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG	7-Mar-19	/	TIMUR LAUT	14/3/2019			UKURAN PADANG
6	CKBA2	PEMBINAAN BARU BANGUNAN TAMBAHAN PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) KULIM KEDAH	25-Jan-19	/					BELUM TERIMA MAKLUMAT UKUR (HOPT)
7	CKP	PEMBINAAN BARU PUSAT ANAK PERMATA NEGARA (PAPN) KUALA KRAI, KELANTAN	13-Feb-19	/	TIMUR LAUT	21/2/2019	4/3/2019		PENYEDIAAN PLAN
8		PEMBINAAN GANTIAN PENUH 24 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK TOK BALI, PASIR PUTEH, NEGERI KELANTAN	15-Jan-19	/	TIMUR	20/2/2019	27/2/2019		PENYEDIAAN PLAN
9		PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 36 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK PUTRAJAYA PRESINT 8(3)	15-Jan-19	/	TENGAH	24/1/2019	31/1/2019	5/3/2019	SIAP PLAN
10		UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) - KOMPLEKS PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN INSANIAH	15-Jan-19	/	TIMUR	6/3/2019	13/3/2019		PENYEDIAAN PLAN
11		S.K TAMAN AGROPOLITAN, RANTAU MANIS, GUA MUSANG KELANTAN	13-Feb-19	/	TIMUR LAUT	6/3/2019			UKURAN PADANG
12		PEMBINAAN GANTIAN PENUH PEJABAT JABATAN PENDIDIKAN PERLIS DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN PIAWAI	13-Feb-19	/	UTARA	16/2/2019	22/2/2019		SEMAKAN PLAN
13		PERLUASAN PUSAT PERMATA KURNIA DI ZON UTARA	15-Feb-19	/	UTARA	18/2/2019	22/2/2019		SEMAKAN PLAN
14		UMK - PEMBINAAN KOMPLEKS FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (FVB), FAKULTI KEUSAHAWANAN, KOMPLEKS GUNASAMA DAN PENGAJARAN BERPUSAT, KAMPUS BACHOK	11-Feb-19	/					BELUM TERIMA MAKLUMAT UKUR (HOPT)
15		PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 36 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK TAMAN SCIENTEX, PASIR GUDANG, JOHO	15-Jan-19	/	TENGAH	21/2/2019	28/2/2019		SEMAKAN PLAN

PERMOHONAN UKUR IN-HOUSE 2019 (LAPORAN SEHINGGA 19 MAC 2019)

BIL	CAWANGAN PEMOHON	PROJEK	TARIKH TERIMA PERMOHONAN	PENGUKURAN SECARA DALAMAN	UNIT UKUR WILAYAH	MULA UKUR	SIAP UKUR	TARIKH HANTAR	CATATAN
16	CKP	PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 36 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK PUTRAJAYA PRESINT 8(3)	15-Jan-19	/	TENGAH	24/1/2019	31/1/2019	5/3/2019	SIAP PLAN
17		UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS	5-Mar-19	/	UTARA	6/3/2019			UKURAN PADANG
18		PERLUASAN PUSAT PERMATA KURNIA DI ZON SELATAN	17-Jan-19	/	SELATAN	23/1/2019	27/1/2019	TUNGGU KELULUSAN (PPK)	SIAP PLAN
19		PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 36 BILIK DARJAH & LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SMK BOHOR JAYA, LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN	18-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (HOPT)
20		PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 42 BILIK DARJAH & LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SMK BANDAR BARU SG. LALANG, SG. PETANI, KEDAH DARUL AMAN KEMUDAHAN PIWAI	18-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (HOPT)
21		PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN ASRAMA TAHFIZ MODEL ULUL ALBAB (TMUA) UNTUK 320 PELAJAR & LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI TAPAK PTP SMK AGAMA ARAU, PERLIS	18-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (HOPT)
22		PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 30 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SMK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU	18-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (HOPT)
23		PEMBINAAN BANGUNAN TAMBAHAN 6BD & LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK PULAU REDANG BAGI PELAKSANAAN PROGRAM K9	18-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (HOPT)
24		PEMBINAAN GANTIAN PENUH SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS, BESUT, TERENGGANU	18 Mac 2019	/					UKURAN PADANG
25	CKK	PROJEK KUARTERS HOSPITAL PULAU PINANG	11-Dec-18	/	UTARA	22/1/2019	27/1/2019	19/2/2019	SIAP PLAN
26	CKS	PEMBINAAN DEPOT PELURU 6 KOD DI KUALA KETIL, KEDAH	6-Mar-19	/					UKURAN PADANG
27		PEMBINAAN PEJABAT DAN PUSAT LATHAN UNIT KOMANDO 69, PASUKAN GERAKAN KHAS, ULU KINTA PERAK - Keperluan Data Ukur Untuk Kerja Pelebaran Jalan	4-Jan-19	/	TENGAH	12/3/2019			UKURAN PADANG
28		IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) KLANG UTARA, SELANGOR	18-Mar-19	/					UKURAN PADANG
29		IBU PEJABAT POLIS DAERAH (IPD) HULU TERENGGANU	18-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (HOPT)
30	JKR TERENGGANU	CADANGAN BAIKPULIH BANGUNAN 4 TKT, 5 UNIT ASRAMA, 2 UNIT KURTERS DI BEKAS TAPAK KOLEJ ISLAM, SAINS & TEKNOLOGI, AJIL UTK DI JADIKAN SEK. MEN. ISLAM TERENGGANU	25-Jan-19	/	TIMUR	21/1/2019	27/1/2019		PENYEDIAAN PLAN
31		MEMBINA 1BD PRA SEKOLAH DI SK LKTP BELARA, KUALA NERUS	5-Mar-19	/	TIMUR				UKURAN PADANG
32		MEMBINA 1BD PRA SEKOLAH DI SK TENGGU BARIAH, KUALA TERENGGANU	5-Mar-19	/	TIMUR				UKURAN PADANG
33		MEMBINA 1BD PRA SEKOLAH DI SK KEBOR AYAER, KUALA TERENGGANU	5-Mar-19	/	TIMUR				UKURAN PADANG
34		PEMBINAAN BANGUNAN 2 UNIT RUMAH WARDEN DAN DEWAN MAKAN TERMASUK PERALATAN SERTA TEMPAT MEMASAK DLL DIASRAMA SMK JAMBU BONGKOK, MARANG, TERENGGANU	13-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (JKR NEGERI)
35		PEMBINAAN BENGUNAN TAMBAHAN 3BD DAN LAIN-LAIN SPESIFIKASI PENDIDIKAN DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS (PPK) SMK SULTAN MANSOR, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU	13-Mar-19	/					TIADA MAKLUMAT UKUR LENGKAP (JKR NEGERI)

STATUS PERLANTIKAN PERUNDING UKUR TANAH SEHINGGA 19 MAC 2019

BIL	CAWANGAN PEMOHON	PROJEK	TARIKH TERIMA PERMOHONAN	LANTIKAN PERUNDING	STATUS
1	CKIP	PROJEK FLOATING JETTY MENGIKUT LOKASI DI 12 JETI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) – KUALA KEDAH, KEDAH	31-Jul-18	/	LULUS JPP CKIP
2		PROJEK FLOATING JETTY MENGIKUT LOKASI DI 12 JETI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) – BATU UBAN, PULAU PINANG	31-Jul-18	/	LULUS JPP CKIP
3		PROJEK FLOATING JETTY MENGIKUT LOKASI DI 12 JETI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) – BATU PAHAT, JOHOR	31-Jul-18	/	LULUS JPP CKIP
4		PROJEK FLOATING JETTY MENGIKUT LOKASI DI 12 JETI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) – KUALA LINGGI, MELAKA	31-Jul-18	/	LULUS JPP CKIP
5		PROJEK FLOATING JETTY MENGIKUT LOKASI DI 12 JETI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) – KEMAMAN, TERENGGANU	31-Jul-18	/	LULUS JPP CKIP
6		PROJEK FLOATING JETTY MENGIKUT LOKASI DI 12 JETI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) – PELABUHAN KELANG, SELANGOR	31-Jul-18	/	LULUS JPP CKIP
7		PROJEK FLOATING JETTY MENGIKUT LOKASI DI 12 JETI AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM MALAYSIA (APMM) – TOK BALI, KELANTAN	31-Jul-18	/	LULUS JPP CKIP
8		PROJEK MENAIKTARAF SISTEM BULK FUEL INSTALLATION (BFI) SEDIAADA DI PANGKALAN UDARA TUDM SUBANG	29-Nov-18	/	LULUS JPP CKIP
9		PROJEK MEROBOKH DAN MEMBINA SEMULA KEMUDAHAN JETI PENDARATAN PELANCONG DI GUA CHERITA, LANGKAWI KEDAH	13-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
10		PROJEK MEROBOKH DAN MEMBINA SEMULA KEMUDAHAN JETI PENDARATAN PELANCONG DI TELUK MEMPELAM, LANGKAWI KEDAH	13-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
11		PENINGKATAN JETI OPERASI LUMUT	5-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
12	CKBA 1	PEMBANGUNAN 'CANOPY WALK' DI KAWASAN SUNGAI PAPAN, TAMAN NEGERI ROYAL BELUM, PERAK DARUL RIDZUAN	20-Apr-18	/	JPP CKAS
13		PEMBANGUNAN FASA 2 HOTEL WAKAF TAIPING, PERAK	27-Feb-19	/	JPP CKAS
14		PEMBINAAN FASA KEDUA PUSAT LATIHAN LAWAS, SARAWAK		/	LULUS JPP CKAS

BIL	CAWANGAN PEMOHON	PROJEK	TARIKH TERIMA PERMOHONAN	LANTIKAN PERUNDING	STATUS
15	CKBA 2	PEMBINAAN FASA KEDUA INSTITUT KEMAHIRAN ISLAM, SARAWAK		/	LULUS JPP CKAS
16		PEMBINAAN ASRAMA TAMBAHAN SETINGGI 6 TINGKAT UNTUK PELAJAR AKADEMIK SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN (ASRAWA)	19-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
17		PEMBINAAN BLOK ASRAMA DAN BLOK AKADEMIK DARUL QURAN JAKIM, KUALA KUBU BARU, SELANGOR DARUL EHSAN		/	LULUS JPP CKAS
18		DEWAN KOMUNITI KG PATAU-PATAU 1, LABUAN	18-Feb-19	/	MESYUARAT PENYELARASAN PROJEK
19	CKP	PPUM-PEMBINAAN BANGUNAN BAGI PUSAT PERKHIDMATAN RAWATAN PESAKIT LUAR DAN PAKAR	13-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
20		UMK-PEMBINAAN KOMPLEKS FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (FPV) UMK KELANTAN	14-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
21		UMK-PEMBINAAN KOMPLEKS FAKULTI KEUSAHAWANAN UMK KELANTAN	15-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
22		UMK-PEMBINAAN KOMPLEKS GUNASAMA DAN PENGAJARAN BERPUSAT UMK KELANTAN	16-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
23		UPSI-PEMBINAAN BANGUNAN PUSAT KOKURIKULUM DI KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH	14-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
24		UPSI-PEMBINAAN KOMPLEKS PUSAT KESIHATAN DI KAMPUS SULTAN AZLAN SHAH	15-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
25		USM-MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR SEDIAADA BAGI PERKHIDMATAN PERAWATAN KRITIKAL HUSM, KAMPUS KESIHATAN	16-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
26		USM-PEMBINAAN TANGKI AIR MENARA DAN RUMAH PAM AIR DI KAMPUS KESIHATAN	17-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
27		UNISZA-KOMPLEKS SUKAN KAMPUS GONG BADAK	25-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
28		UTHM-PEMBANGUNAN PUSAT TEKNOLOGI AERONAUTIK DI TANJUNG LABOH	14-Feb-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
29		PEMBINAAN SEKOLAH BAHARU 42 BILIK DARJAH DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT MAHKOTA BANGI, HULU LANGAT SELANGOR	13-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP


BIL	CAWANGAN PEMOHON	PROJEK	TARIKH TERIMA PERMOHONAN	LANTIKAN PERUNDING	STATUS
30	CKP	SMK ULU SAPI	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
31		SMK ULU SAPI II	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
32		PEJ PENDIDIKAN DAERAH SIPITANG	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
33		SMK TANDEK KOTA MARUDU	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
34		SM SAINS SABAH	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
35		SMK TATAU SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
36		SMK PADAWAN SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
37		SMK LAKE SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
38		SMK SRI SADONG SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
39		SM PENDIDIKAN KHAS VOKASIONAL SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
40		SK DALAT SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
41		SK RANTAU PANJANG SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
42		SMK KANOWIT SARAWAK	20-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP

BIL	CAWANGAN PEMOHON	PROJEK	TARIKH TERIMA PERMOHONAN	LANTIKAN PERUNDING	STATUS
43	CKK	KUARTERS HOSPITAL PULAU PINANG	6-Mar-19	/	PENYEDIAAN DOKUMEN JPP
44		KLINIK KESIHATAN (JENIS 3) DAN PUSAT PAKAR PERGIGIAN PRESINT 6, PUTRAJAYA	15-Jan-19	/	LULUS JPP CKAS
45		HOSPITAL MARAN, PAHANG	23-Mar-18	/	LULUS JPP CKAS
46		KLINIK KESIHATAN (JENIS 5) BEBULOH, LABUAN	14-Feb-18	/	LULUS JPP CKAS
47		PEMBINAAN BANGUNAN BAHARU BAGI MAIN SWITCH BOARD (MSB) DAN PENAMBAHAN KAPASITI GENSET HOSPITAL SULTAN HAJI AHMAD SHAH, TEMERLOH. PAHANG	31-May-18	/	LULUS JPP CKAS
48		PEMBINAAN INSTITUT PERUBATAN FORENSIK NEGARA (NIFM)	15-Jan-19	/	LULUS JPP CKAS
49	CKS	PEMBINAAN RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA SUNGAI PANCHING, KUANTAN PAHANG	15-Feb-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
50		PEMBINAAN RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA LABUAN, WP LABUAN	16-Feb-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
51		PEMBINAAN RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA TAWAU, SABAH	17-Feb-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
52		PEMBINAAN RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA PULAU INDAH, SELANGOR	18-Feb-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
53		PEMBINAAN RUMAH KELUARGA ANGKATAN TENTERA KOTA BELUD, SABAH	19-Feb-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
54		MEMBINA DAN MEROBOH SERTA MENAIKTARAF CCRC KARAK, PAHANG	21-Mar-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
55		PENJARA KKOTA KINABALU SABAH	21-Mar-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
56		KUARTERS AKADEMI KOREKSIONAL MALAYSIA LANGKAWI	21-Mar-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT
57		KUARTERS PENJARA SEREMBAN NEGERI SEMBILAN	21-Mar-19	/	MENUGGU MAKLUMAT DR HOPT

CARTA ORGANISASI DAN PERJAWATAN BAHAGIAN UKUR TANAH

CAWANGAN KEJURUTERAAN DAN INFRASTRUKTUR

CARTA PERJAWATAN BAHAGIAN UKUR TANAH, CAWANGAN KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN, JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
SEHINGGA FEBRUARI 2019

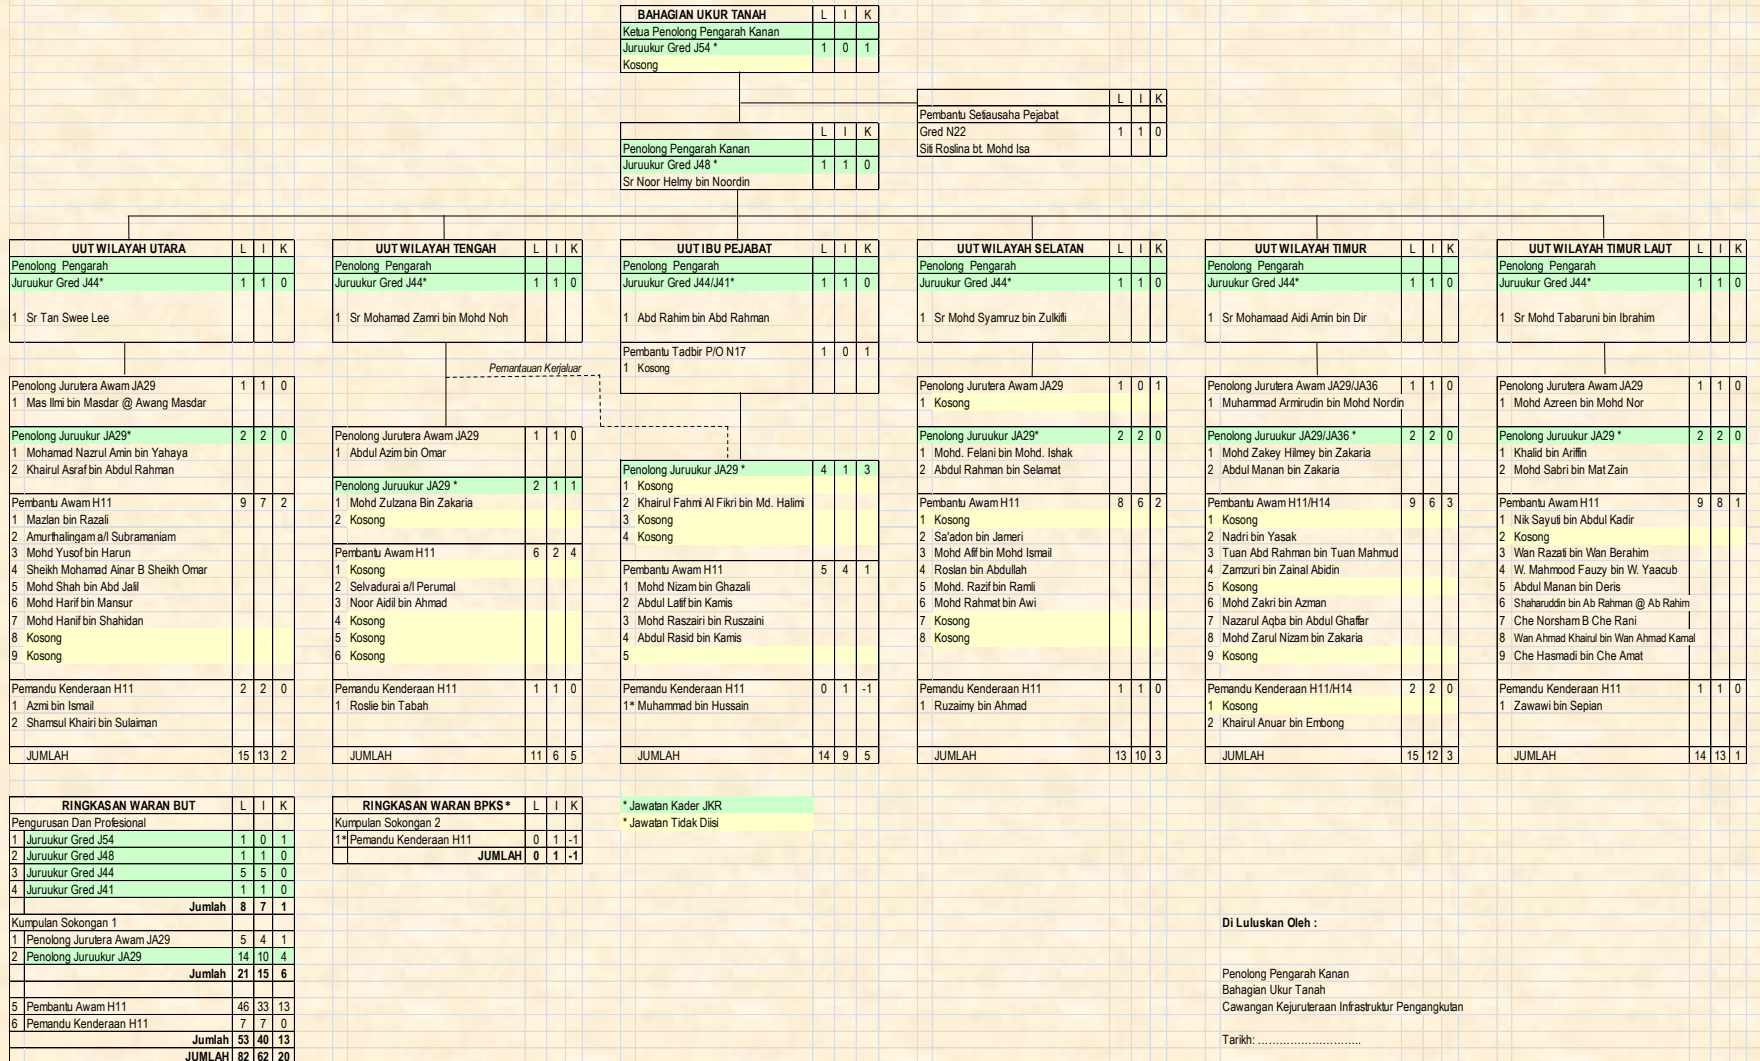

Di Luluskan Oleh :

Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Ukur Tanah
Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan

Tarikh:

RINGKASAN KEDUDUKAN FAIL PENGUKURAN IN-HOUSE SEHINGGA 19 MAC 2019

1	Ukuran Padang	12
2	Semakan Pelan	4
3	Penyediaan Pelan/Proses Data	4
4	Pelan Siap ke HOPT	5
5	Maklumat Permohonan Ukur Tidak Lengkap	10
	Jumlah Fail PU	35

RINGKASAN KEDUDUKAN FAIL LANTIKAN PERUNDING UKUR TANAH SEHINGGA 21 MAC 2019

1	Penyediaan Dokumen JPP (TOR, Anggaran Kos Perunding, Penilaian Teknikal Perunding & Pengesyoran Nama Perunding)	30
2	Lulus JPP CKIP/CKAS	18
3	Maklumat Permohonan Ukur Tidak Lengkap	9
	Jumlah Fail PU	57

TERIMA KASIH

