



SISTEM PENGURUSAN PROJEK (SKALA)

Norazura Atan

**Unit Pengurusan Projek SKALA
BTM, CDPK**

25 Januari 2021

SKALA – SISTEM KAWAL DAN LAPOR

- Aplikasi Web Pemantauan Kemajuan Projek JKR secara dalam talian (*online*)
- Penggunaan oleh semua pejabat JKR Malaysia dengan fungsi utama sebagai 1 mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Projek JKR



OBJEKTIF

Penjanaan Laporan Projek dari segi **Masa** dan **Kos** secara *real time* bagi tujuan prestasi dan pemantauan.


PENJANAAN




Laporan Projek

Real Time



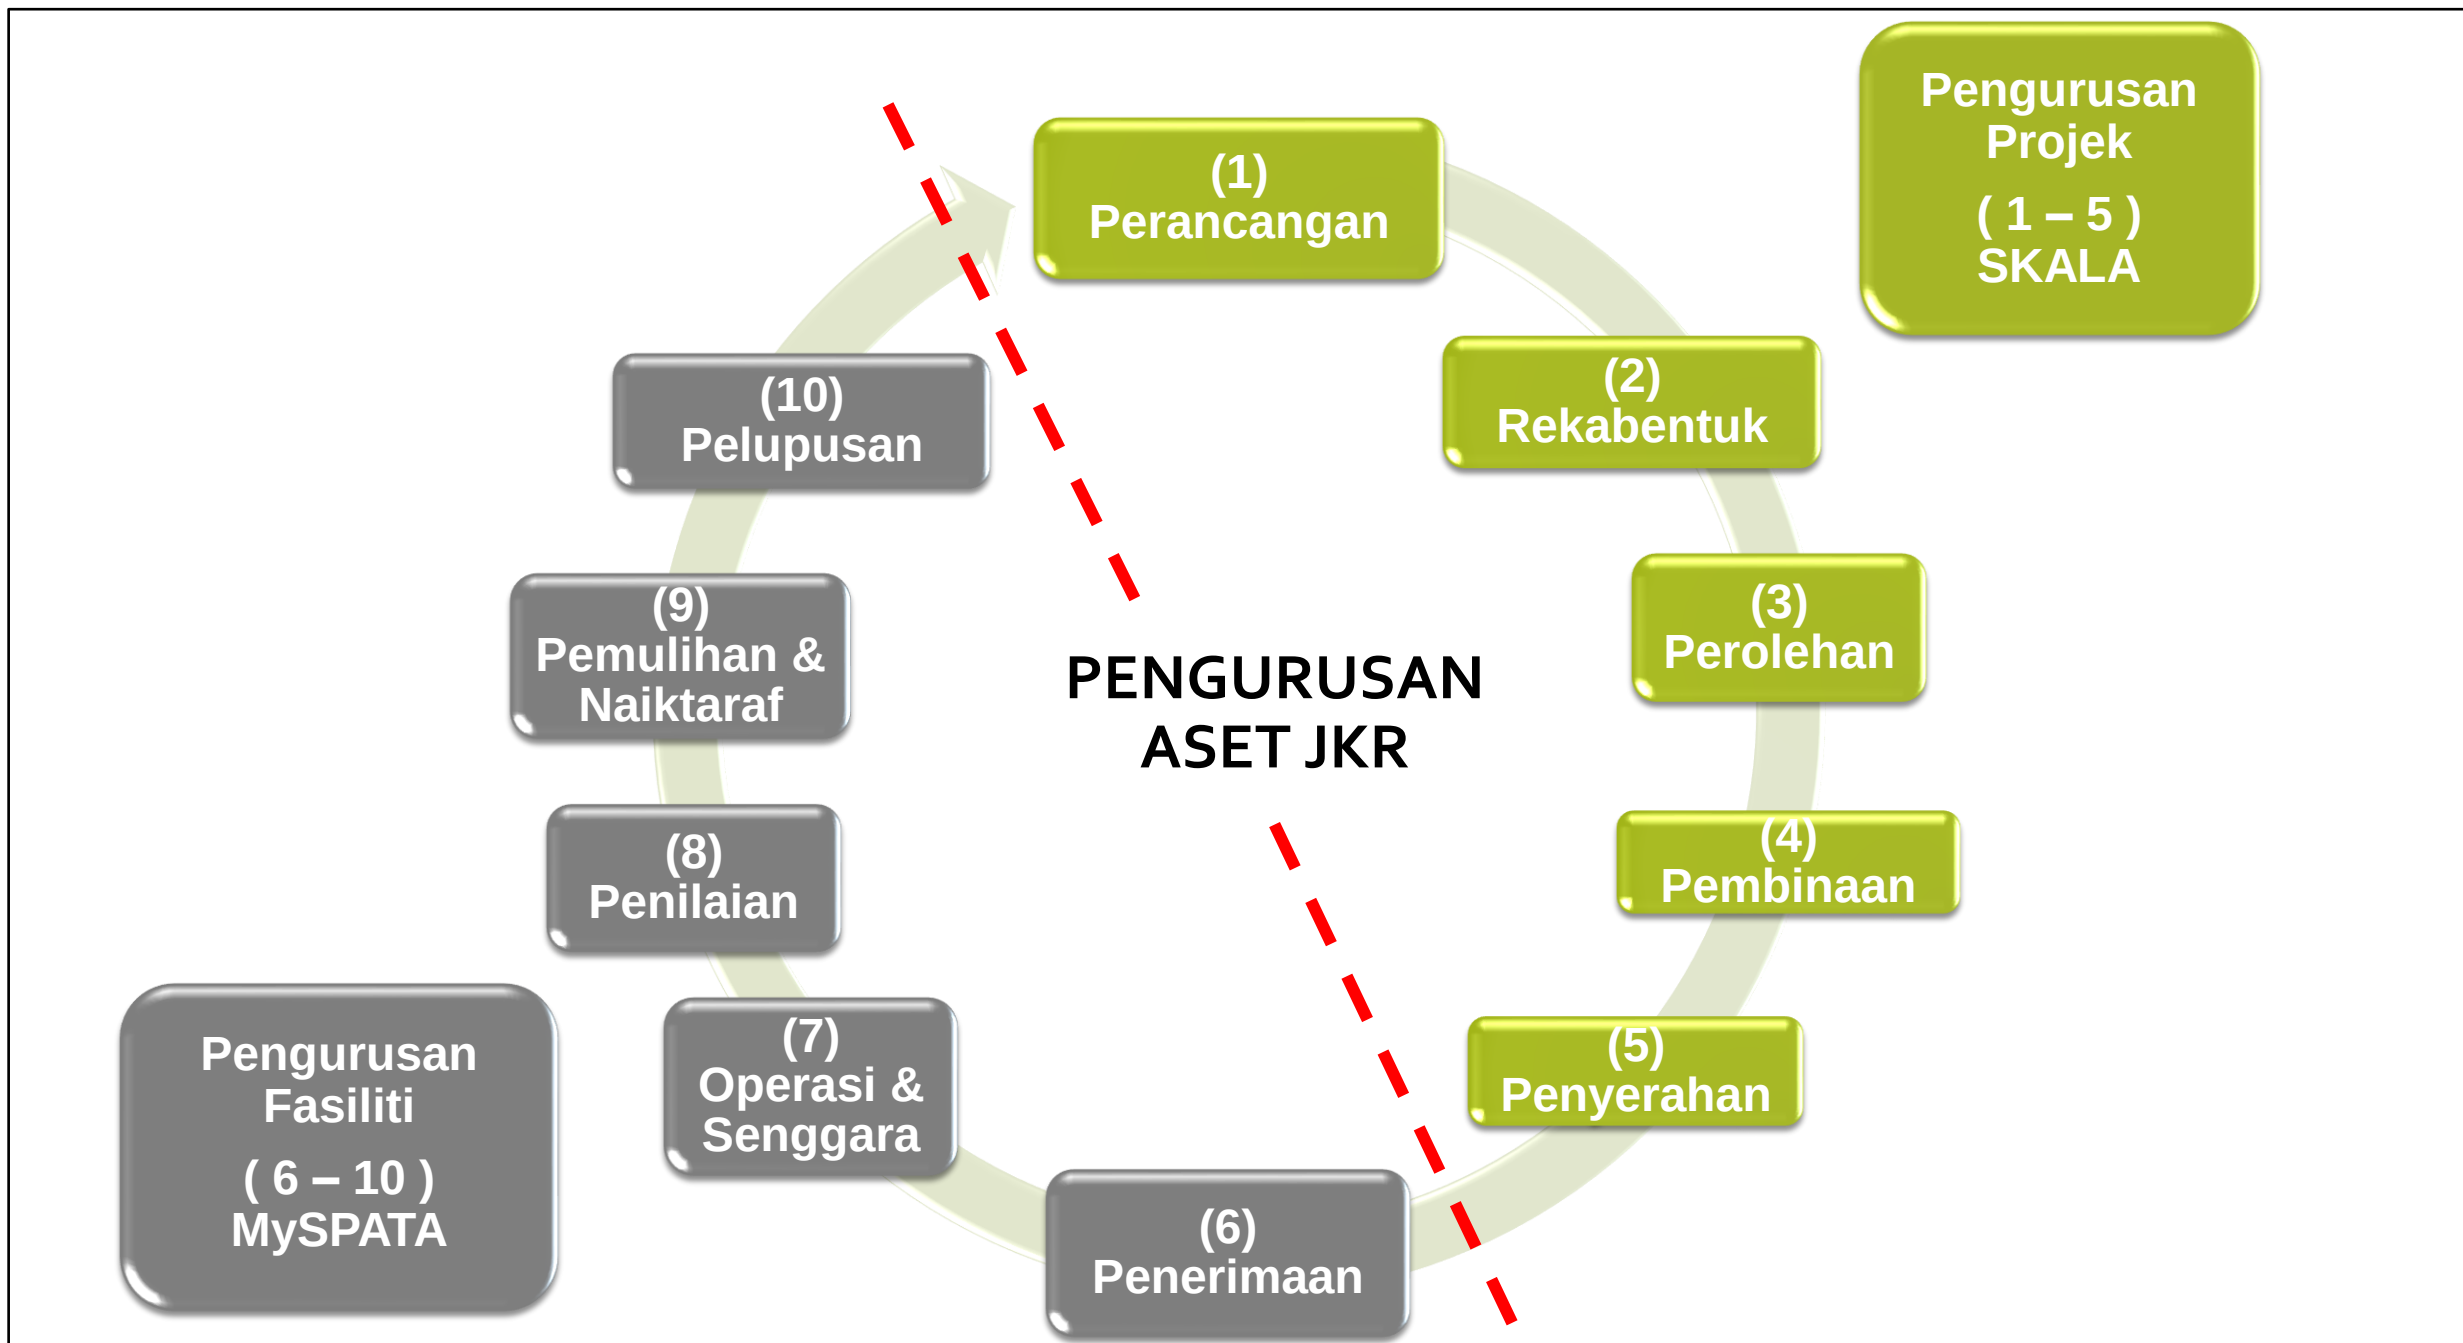

MODUL SKALA

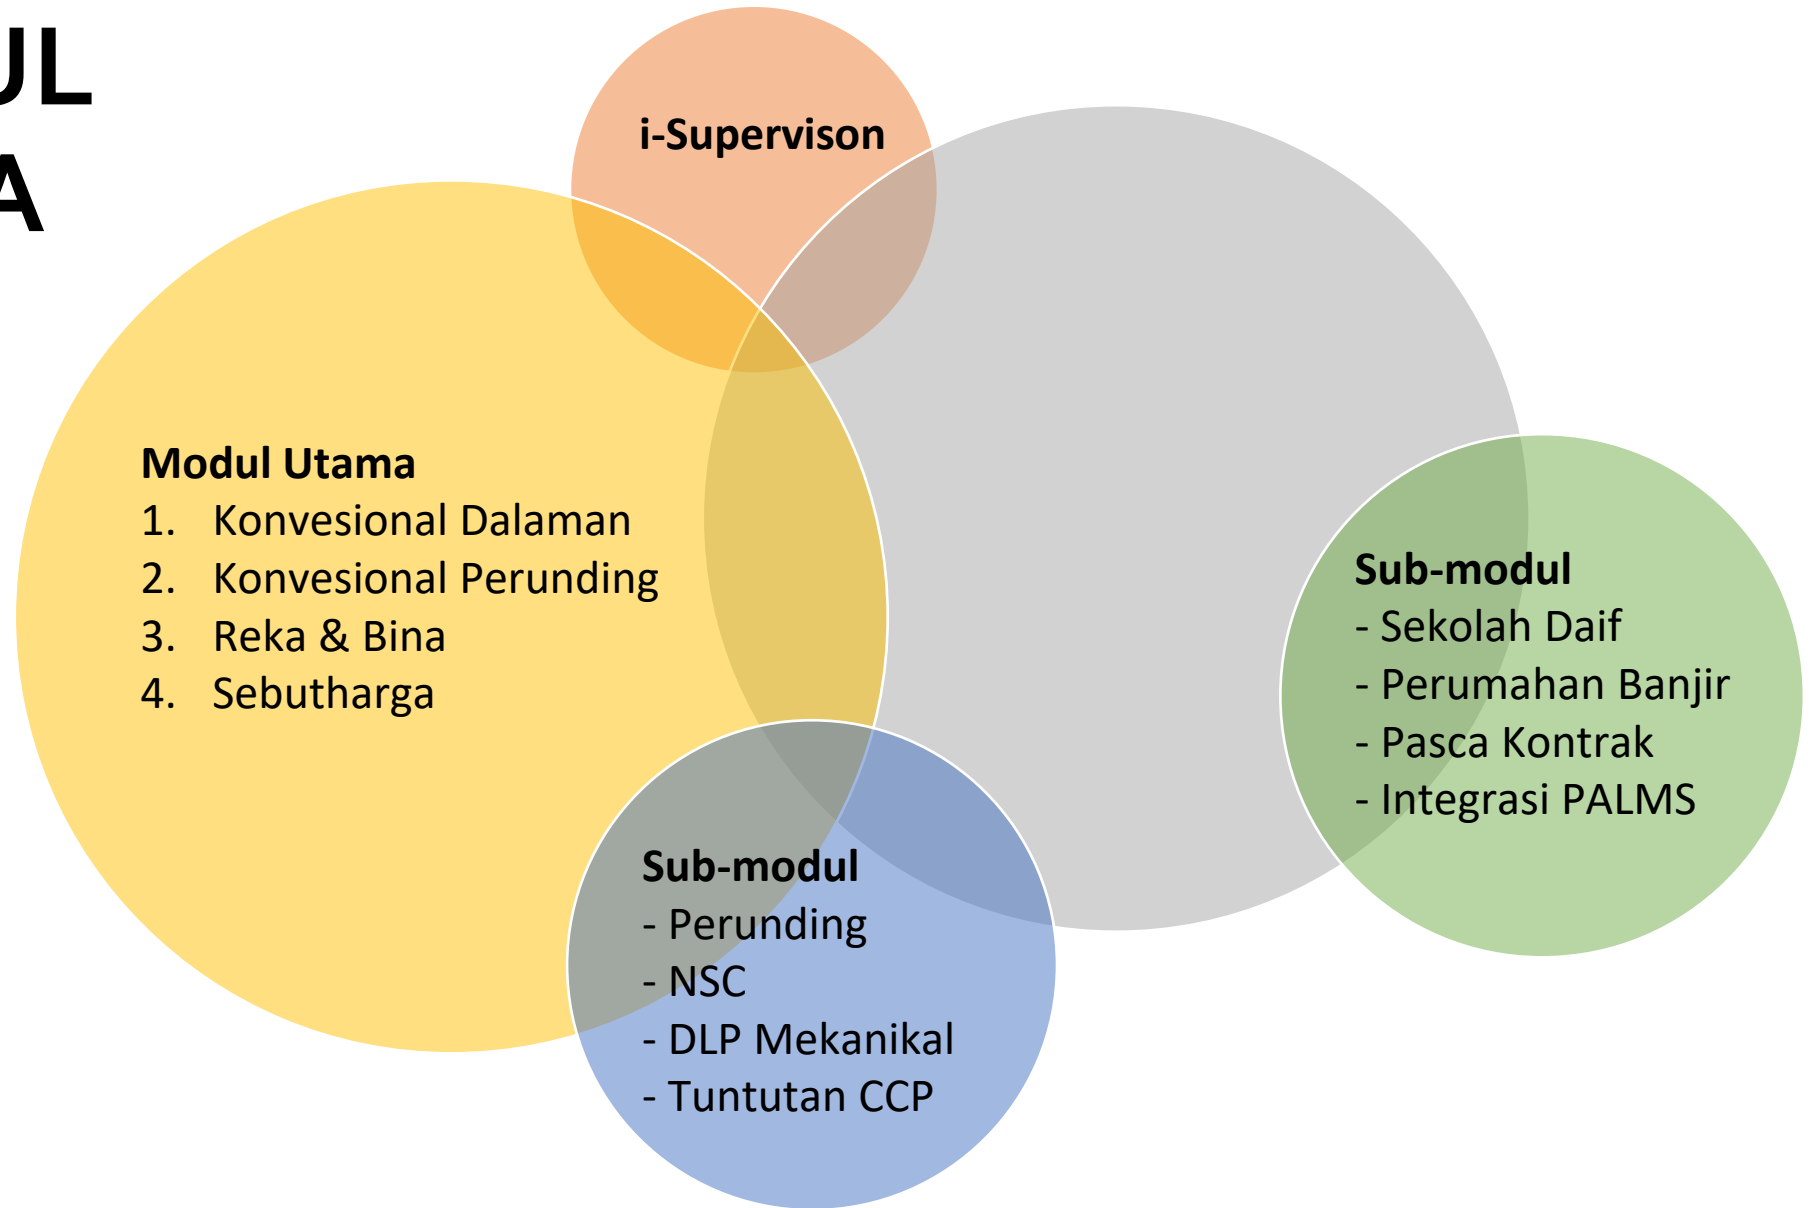


KATEGORI PROJEK



KELEBIHAN SKALA

- Input Data secara atas talian

Surat secara online dalam SKALA

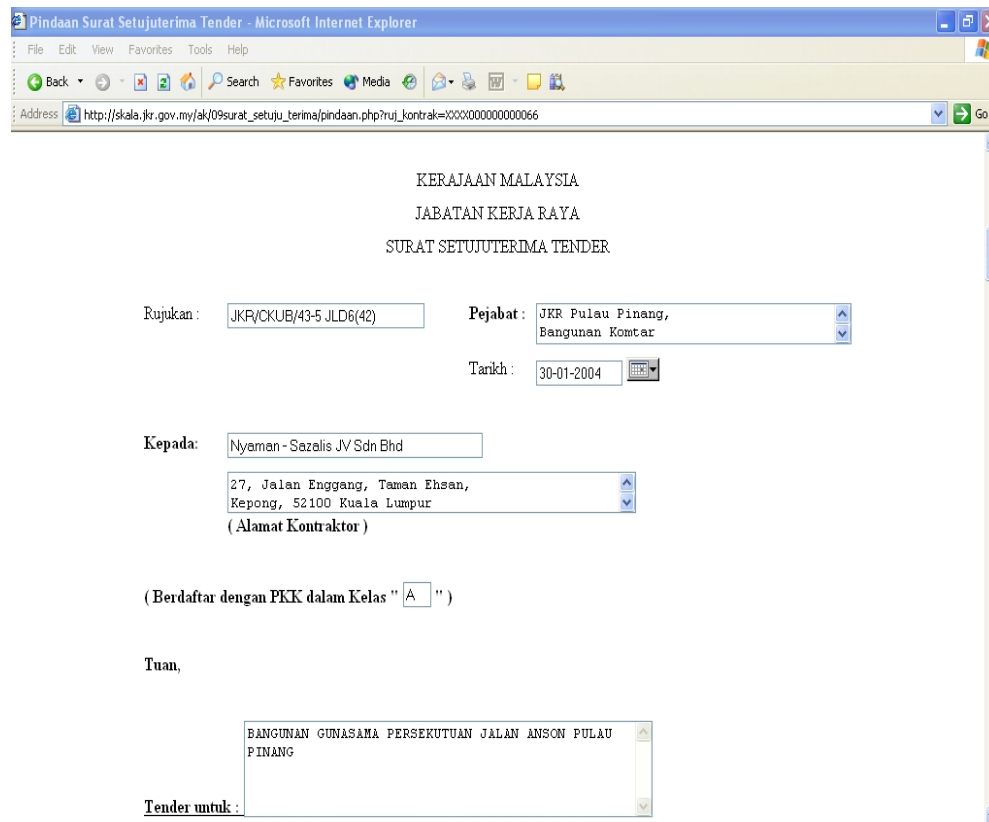

The screenshot shows a web browser window titled "Pindaan Surat Setujuterima Tender - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: http://skala.jkr.gov.my/ak/09surat_setuju_terima/pindaan.php?ruj_kontrak=XXXX000000000066. The form content is as follows:

KERAJAAN MALAYSIA
JABATAN KERJA RAYA
SURAT SETUJUTERIMA TENDER

Rujukan : Pejabat :

Tarikh :

Kepada :

(Alamat Kontraktor)

(Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " ")

Tuan,

Tender untuk :

Surat Piawai (Hardcopy)

KERAJAAN

JABATAN KERJA RAYA
SURAT SETUJUTERIMA TENDER

Rujukan: Pejabat:
.....
.....
Tarikh:

Kepada:

(Kontraktor)

(Berdaftar dengan PKK dalam Kelas " ")

Tuan,

Tender untuk

Dengan ini adalah diberitahu bahawa Tender tuan bagi kerja-kerja tersebut di atas berharga Ringgit: telah disetujuterima, tertakluk kepada had, syarat dan perjanjian dalam Dokumen Tender yang menjadi asas Tender ini dan juga kepada surat ini.

2. Tuan dikehendaki melaksanakan Perjanjian Kontrak yang formal dalam sedikit masa lagi. Bagaimanapun, sehinggalah Perjanjian Kontrak yang formal itu dilaksanakan, Tender tuan berserta Surat Setujuterima Tender ini akan menjadi kontrak yang sah mengikat di antara tuan dan Kerajaan.


3. * Adalah dimaklumkan harga dan kadar harga dalam Jadual Kadar Harga dan/atau Ringkasan Tender atau Senarai Kuantiti, mengikut mana yang berkenaan, akan diteliti dan diselaraskan oleh Pegawai Penguasa berdasarkan surat pejabat ini bil. () bertarikh

KELEBIHAN SKALA

- Pemantauan projek melalui Graf Kemajuan Kerja

Maklumat Kemajuan Fizikal	% Kemajuan Kerja Fizikal 2.00% (sehingga 14-03-2018)	% Jadual Kerja Fizikal 1.45% (sehingga 14-03-2018)	Kemajuan Kerja Fizikal Ikut Jadual (sehingga 14-03-2018)
---------------------------	---	---	---

Graf Kemajuan Kerja Fizikal Berbanding Unjuran Fizikal

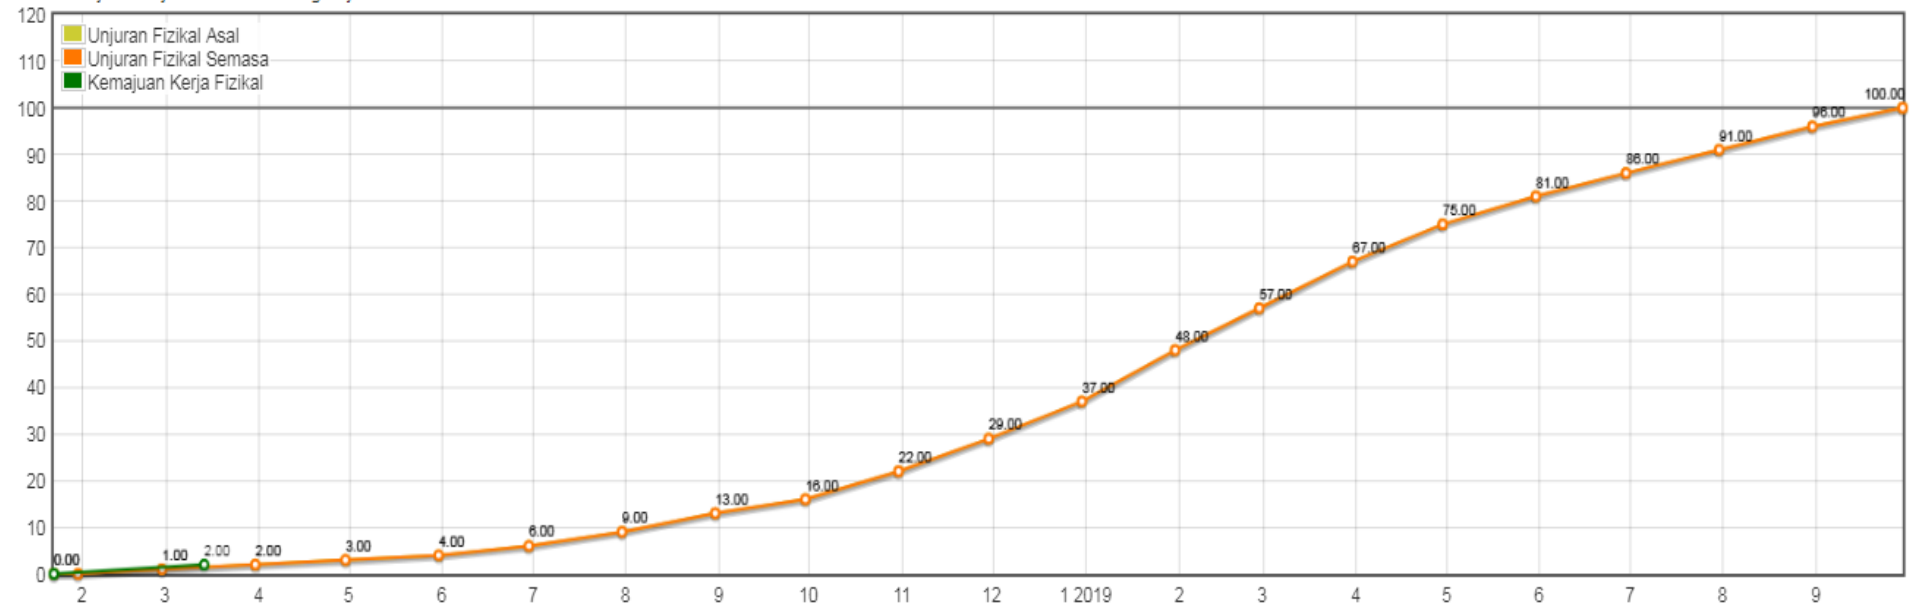

- Laporan Statistik

Bagi Pejabat Pengurus Program Untuk Projek (Persekutuan/Negeri/Projek KKR) Persekutuan Mengikut RMK Semua Klik

[illegible]

KELEBIHAN SKALA

- i-Supervision






Sistem Pemantauan Projek Bergambar

Laman Utama
Projek
Pengenalan
Status Kamera
Selenggara

Carian: Cari

Daftar Projek

Status:
RMK:
Pejabat:

Senarai Projek CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

Bil	Gambar Terkini	a. Tajuk Projek b. Lokasi Tapak c. Kategori d. RMK	a. Kementerian Pelanggan b. Pejabat Pengurus Program c. Pejabat Penolong Pengurus Program d. Pejabat HOPT e. Pejabat Selia Tapak	a. Nama HOPT b. Nama Pegawai Seliatapak
1		a. HOSPITAL PETRA JAYA, SARAWAK b. Kuching c. Persekutuan d. RMK 10 1st Rolling Plan	a. KEMENTERIAN KESIHATAN b. CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK) c. PEJABAT PENGURUSAN PORTFOLIO (PMO-CKK) d. CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK) e.	a. Azman bin Abdul Manaf b. Pauzi bin Mohamad
2		a. HOSPITAL PENDANG KEDAH b. Pendang c. Persekutuan d.	a. KEMENTERIAN KESIHATAN b. CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK) c. PEJABAT PENGURUSAN PORTFOLIO (PMO-CKK) d. CAWANGAN KERJA KESIHATAN (CKK) e.	a. Mohamad Farijal bin Othman b. Amir Abdul Hakim B. Hanafiah

ALIRAN KERJA – Fasa Perancangan

## | Norazura Bt Atan dari CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

[LAMAN UTAMA](#)[ALIRAN KERJA](#)[LAPORAN](#)

19/01/2021 | [LOG KELUAR](#)

Taip di sini untuk carian

[Projek](#)[Kontrak](#)[Kontraktor](#)

[Projek](#) → [Aliran Kerja](#)

[Aliran Kerja](#)[Butiran Projek](#)[Senarai Cetak Pdf](#)

[Tangguh Projek \(HOPT\)](#)[Hapus Projek](#)[Pelepasan Projek](#)[Pembatalan Projek \(HOPT\)](#)[History](#)[States](#)[Maklumbalas \(0\)](#)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN DAN HAKISAN PANTAI BAGI PREMIS POLIS DIRAJA MALAYSIA - KERJA PEMBAIKAN CERUN DI KUARTERS C1 & C2, IPD RAUB, PAHANG

Maklumat Asas Projek

Rujukan SKALA

SKL0201/B20/28917/22020/0/TB/KD

Tarikh Terima Brif/Tapak/Siling

- Brif telah diterima : 08-05-2020
- Tapak telah diterima : 08-05-2020
- Siling telah diterima : 25-11-2020

Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat

-

Tarikh Pendaftaran Projek

27-11-2020

Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh)

-

RM Wujud Projek

11

RM Semasa Projek

11

Selenggara Tarikh Sah Sah Brif

30-11-2020

Rancangan Malaysia

RMK11 4th Rolling Plan 2020 SPPII

Kategori Projek

Persekutuan

Penolong Pengurus Program

CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

Pejabat HOPT

CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

Skop Projek

KERJA PEMBAIKAN CERUN DI KUARTERS C1 & C2, IPD RAUB, PAHANG

Maksud Pembangunan

P

Wakil/Pengurus Program

CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

Pejabat Pelanggan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)

Kos Projek Asal

RM 2,500,000.00

Kos Projek Semasa

RM 2,500,000.00

Kaedah Pelaksanaan

Sah Terkini : Tiada
Pindaan Semasa : Konvensional (Dalamam)

Jenis Perolehan

Sah Terkini : Tiada
Pindaan Semasa : Tender Terbuka

Integrasi Primavera

Tiada

Interaksi QPlan, DPlan & CPlan

Bil	Pejabat Tanggungjawab	QPlan			DPlan			CPlan		
		Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah
1.	HOPT : CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)									
	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk QPlan	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk DPlan								
	23-02-2021	-								
2	Ukur Bahan									

1. Perancangan

1.1 Catatan Projek

- Tambah Catatan Projek: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
- Senarai Catatan Projek: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
- Kepilan Projek: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
- Senarai Kepilan Projek: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

1.2 Strategi Pelaksanaan

- Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek
- Pindaan Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada Aedia Juhana binti Abdul Rahim dari CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
- Cetak Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada Aedia Juhana binti Abdul Rahim dari CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

1.3 Penentuan HOPT Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3

Sila pilih Nama Pegawai Yang Diberi Kuasa membuat penilaian Gerbang Nilai dalam Sistem SKALA.

- Pilih / Penentuan Semula HOPT Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

1.4 Penentuan Pengarah Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3

Sila pilih Nama Pengarah Yang Diberi Kuasa membuat kelulusan Gerbang Nilai dalam Sistem SKALA.

- Pilih / Penentuan Semula Pengarah Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

1.5 Pelan Kualiti Projek

- Cetak Q-Plan: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
- Pinda Q-Plan ditugaskan kepada AZRAIE B. ABD. JALAL (HOPT): ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
- Sah Q-Plan: ditugaskan kepada CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)

D Plan Ukur Bahan

- Cetak D-Plan Ukur Bahan: ditugaskan kepada UNIT UKUR BAHAN (CERUN)
- Sedia D-Plan Ukur Bahan: ditugaskan kepada Muhammad Ashraf bin Mahdzir UNIT UKUR BAHAN (CERUN)
- Sah D Plan: ditugaskan kepada UNIT UKUR BAHAN (CERUN)

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

5. Penyerahan

ALIRAN KERJA – Fasa Rekabentuk

[Projek](#) → Aliran Kerja

[Aliran Kerja](#) [Butiran Projek](#) [Senarai Cetak Pdf](#)

[Tangguh Projek \(HOPT\)](#) [Hapus Projek](#) [Pelepasan Projek](#) [Pembatalan Projek \(HOPT\)](#) [History](#) [States](#) [Maklumbalas \(0\)](#)

MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI PROJEK MEMBINA JAMBATAN BARU DI KG. SAWA DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN, DAERAH HULU PERAK DARUL RIDZUAN (PASCA BANJIR)

Maklumat Asas Projek

Rujukan SKALA	SKL0201/B19/28918/22034/0/TB/KD
Tarikh Terima Brif/Tapak/Siling	- Brif telah diterima : 12-07-2019 - Tapak telah diterima : 12-07-2019 - Siling telah diterima : 12-07-2019
Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat	-
Tarikh Pendaftaran Projek	05-08-2019
Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh)	-
RM Wujud Projek	11
RM Semasa Projek	11
Rancangan Malaysia	RMK11 Bukan Rolling Plan
Kategori Projek	Persekutuan dilaksanakan secara Pakej
Penolong Pengurus Program	JKR NEGERI PERAK (PRK)
Pejabat HOPT	BHG. JALAN (PRK)
Skop Projek	MENYIAPKAN KERJA-KERJA TERBENGKALAI BAGI MEMBINA JAMBATAN BARU DI KG. SAWA DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN
Maksud Pembangunan	P22
Wakil/Pengurus Program	CAWANGAN JALAN (CJ)
Pejabat Pelanggan	KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)
Kos Projek Asal	RM 5,000,000.00
Kos Projek Semasa	RM 5,000,000.00
Kaedah Perlaksanaan	Sah Terkini : Konvensional (Dalaman) Pindaan Semasa : Tiada
Jenis Perolehan	Sah Terkini : Tender Terbuka Pindaan Semasa : Tiada
Integrasi Primavera	Tiada

Interaksi QPlan, DPlan & CPlan

Bil	Pejabat Tanggungjawab	QPlan			DPlan			CPlan		
		Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah
1.	HOPT : BHG. JALAN (PRK)									
	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk QPlan			✓						
	31-10-2019									
2.	Ukur Bahan HODT : BHG. KONTRAK & U/BAHAN (PRK) 06-08-2019 sehingga 13-09-2019						✓			

NOTA: Tarikh maksimum DPlan Mekanikal & Elektrikal yang dilaksanakan secara NSC diambil dari Bahagian 1: Komponen Rekabentuk dalam DPlan.

1. Perancangan

- 1.1 Catatan Projek**
 - Tambah Catatan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN JALAN \(CJ\)](#)
 - Senarai Catatan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN JALAN \(CJ\)](#)
 - Kepilan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN JALAN \(CJ\)](#)
 - Senarai Kepilan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN JALAN \(CJ\)](#)
- 1.2 Strategi Pelaksanaan**
 - [Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek](#)
 - Pindaan Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada [syazwani binti zahari](#) dari [CAWANGAN JALAN \(CJ\)](#)
 - Cetak Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada [syazwani binti zahari](#) dari [CAWANGAN JALAN \(CJ\)](#)
- 1.3 Penentuan HOPT Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3**

Sila pilih Nama Pegawai Yang Diberi Kuasa membuat penilaian Gerbang Nilai dalam Sistem SKALA.

 - Pilih / Penentuan Semula HOPT Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3: ditugaskan kepada [BHG. JALAN \(PRK\)](#)
- 1.4 Penentuan Pengarah Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3**

Sila pilih Nama Pengarah Yang Diberi Kuasa membuat kelulusan Gerbang Nilai dalam Sistem SKALA.

 - Pilih / Penentuan Semula Pengarah Bagi Gerbang Nilai 1 Hingga Gerbang Nilai 3: ditugaskan kepada [BHG. JALAN \(PRK\)](#)
- 1.5 Pejabat Bertanggungjawab Bagi Kewangan Projek**
 - Pejabat Bertanggungjawab Bagi Kewangan Projek: ditugaskan kepada [BHG. JALAN \(PRK\)](#)
- # Peringkat Projek**
 - Rancang Kewangan Projek: ditugaskan kepada [BHG. JALAN \(PRK\)](#)
 - Peruntukan Projek: ditugaskan kepada [BHG. JALAN \(PRK\)](#)
 - Perbelanjaan Projek: ditugaskan kepada [JKR\(D\) HULU PERAK \(PRK\)](#)
- # Peringkat Negeri**
 - Rancang Kewangan Projek Negeri: ditugaskan kepada [JKR\(D\) HULU PERAK \(PRK\)](#)
 - Peruntukan Projek Negeri: ditugaskan kepada [JKR\(D\) HULU PERAK \(PRK\)](#)
 - Perbelanjaan Projek Negeri: ditugaskan kepada [JKR\(D\) HULU PERAK \(PRK\)](#)
- 1.6 Pelan Kualiti Projek**
 - Pindaan Versi Q-Plan ditugaskan kepada [IR. ZAIZUL HISHAM ZAINOL \(HOPT\)](#): ditugaskan kepada [BHG. JALAN \(PRK\)](#)
 - Senarai Cetak Versi QPlan: ditugaskan kepada [BHG. JALAN \(PRK\)](#)

2. Rekabentuk

- 2.1 Penyerahan Dokumen Ukur Bahan**
 - Sedia Penyerahan Dokumen Ukur Bahan: ditugaskan kepada [Ahmad Shabudin b. Matt BHG. KONTRAK & U/BAHAN \(PRK\)](#)

3. Perolehan

ALIRAN KERJA – Fasa Perolehan



| Norazura Bt Atan dari CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

[LAMAM UTAMA](#) [ALIRAN KERJA](#) [LAPORAN](#)

19/01/2021 | [LOG KELUAR](#)

Taip di sini untuk carian

[Projek](#)

[Kontrak](#)

[Kontraktor](#)

[Projek](#) → [Aliran Kerja](#)

[Aliran Kerja](#) [Butiran Projek](#) [Senarai Cetak Pdf](#) [Aliran Kerja NSC](#)

[Tangguh Projek \(HOPT\)](#)

[Hapus Projek](#)

[Pelepasan Projek](#)

[Pembatalan Projek \(HOPT\)](#)

[History](#)

[States](#)

[Maklumbalas \(1\)](#)

DAIF PERAK (2020)- GANTIAN DAN BINA BARU BLOK PRA SEKOLAH YANG MENGANDUNGI 2DB SERTA BLOK PENDIDIKAN KHAS (3BD) DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN DI SK BAGAN SERAI, PERAK.

Maklumat Asas Projek

Rujukan SKALA	SKL0307/B20/28334/21873/0/TB/KD
Tarikh Terima Brif/Tapak/Siling	- Brif telah diterima : 31-12-2019 - Tapak telah diterima : 31-12-2019 - Siling telah diterima : 31-12-2019
Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat	-
Tarikh Pendaftaran Projek	02-01-2020
Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh)	-
RM Wujud Projek	11
RM Semasa Projek	11
Rancangan Malaysia	RMK11 Bukan Rolling Plan
Kategori Projek	Persekutuan dilaksanakan secara Pakej
Penolong Pengurus Program	BHG. BANGUNAN (PRK)
Pejabat HOPT	BHG. BANGUNAN (PRK)
Skop Projek	PROJEK DAIF PERAK (2020)-GANTIAN DAN BINA BAHARUU BLOK PRA SEKOLAH SERTA BLOK PENDIDIKAN KHAS DAN BILIK GURU DI SK BAGAN SERAI PERAK
Maksud Pembangunan	P 0
Wakil/Pengurus Program	JKR NEGERI PERAK (PRK)
Pejabat Pelanggan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Kos Projek Asal	RM 6,618,000.00
Kos Projek Semasa	RM 6,618,000.00
Kaedah Perlaksanaan	Sah Terkini : Konvensional (Dalam) Pindaan Semasa : Tiada
Jenis Perolehan	Sah Terkini : Tender Terbuka Pindaan Semasa : Tiada
Integrasi Primavera	Tiada

Interaksi QPlan, DPlan & CPlan

Bil	Pejabat Tanggungjawab	QPlan			DPlan			CPlan		
		Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah
1.	HOPT : BHG. BANGUNAN (PRK)									
	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk QPlan									
	16-10-2020									
2.	Senibina									
	HOPT : BHG. ARKITEK (PRK)									

1. Perancangan

1.1 Catatan Projek

- Tambah Catatan Projek: ditugaskan kepada [JKR NEGERI PERAK \(PRK\)](#)
- Senarai Catatan Projek: ditugaskan kepada [JKR NEGERI PERAK \(PRK\)](#)
- Kepilan Projek: ditugaskan kepada [JKR NEGERI PERAK \(PRK\)](#)
- Senarai Kepilan Projek: ditugaskan kepada [JKR NEGERI PERAK \(PRK\)](#)

1.2 Strategi Pelaksanaan

- [Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek](#)
- Pindaan Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada [PILUS BIN AHMAD ZABRI](#) dari [JKR NEGERI PERAK \(PRK\)](#)
- Cetak Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada [PILUS BIN AHMAD ZABRI](#) dari [JKR NEGERI PERAK \(PRK\)](#)

1.3 Pejabat Bertanggungjawab Bagi Kewangan Projek

- Pejabat Bertanggungjawab Bagi Kewangan Projek: ditugaskan kepada [BHG. BANGUNAN \(PRK\)](#)

Peringkat Projek

- Rancang Kewangan Projek: Pejabat Belum Ditentukan
- Peruntukan Projek: Pejabat Belum Ditentukan
- Perbelanjaan Projek: Pejabat Belum Ditentukan

Peringkat Negeri

- Rancang Kewangan Projek Negeri: Pejabat Belum Ditentukan
- Peruntukan Projek Negeri: Pejabat Belum Ditentukan
- Perbelanjaan Projek Negeri: Pejabat Belum Ditentukan

1.4 Pelan Kualiti Projek

- Pindaan Versi Q-Plan ditugaskan kepada [TAJUDDIN B. YAHAYA \(HOPT\)](#): ditugaskan kepada [BHG. BANGUNAN \(PRK\)](#)
- Senarai Cetak Versi QPlan: ditugaskan kepada [BHG. BANGUNAN \(PRK\)](#)

2. Rekabentuk

3. Perolehan

3.1

- Surat Kepada Lembaga Tender
- Cetak Surat Kepada Lembaga Tender:
- Sedia Surat Kepada Lembaga Tender: ditugaskan kepada [BHG. KONTRAK & U/BAHAN \(PRK\)](#)

4. Pembinaan

5. Penyerahan

ALIRAN KERJA – Fasa Pembinaan



| Norazura Bt Atan dari CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

LANAMAN UTAMA ALIRAN KERJA LAPORAN

19/01/2021 | LOG KELUAR

Taip di sini untuk carian Projek Kontrak Kontraktor

Projek → Aliran Kerja

Aliran Kerja Butiran Projek Butiran Kontrak Senarai Cetak Pdf Gambar Projek Tuntutan / CCP

Hapus Projek Pembatalan Projek (HOPT) History States Maklumbalas (3) Kemaskini Capaian I-Supervision

PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG, PERAK.



- Semua JKR 66 perlu **DISAHKAN** oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa Memperakukan JKR66.
- Bagi tujuan tersebut, Pejabat yang mengendalikan JKR66 perlu menentukan terlebih dahulu Nama Pegawai Yang Memperakukan JKR 66 dalam Sistem SKALA.
- Tuan/Puan tidak dapat meneruskan Aliran Kerja Bayaran dalam SKALA jika Pegawai Berkenaan tidak ditentukan.
- Tindakan yang perlu diambil:
 - Pegawai Pengesyor akan menentukan Pegawai Yang Memperakukan;
 - Pegawai Pengesyor menyediakan JKR66 dan menghantar melalui Aliran Kerja SKALA kepada Pegawai Yang Memperakukan bagi tujuan semakan dan pengesahan ;
 - Pegawai Yang Memperakukan akan mengesahkan atau mengemukakan semula kepada Pegawai Pengesyor bagi pindaan bayaran tersebut melalui Sistem SKALA.

Maklumat Asas Projek

Rujukan SKALA	SKL0201/B18/27363/21206/17979/TB/KD
Tarikh Terima Brif/Tapak/Siling	- Brif telah diterima : 22-03-2018 - Tapak telah diterima : 22-03-2018 - Siling telah diterima : 01-05-2019
Tarikh Pendaftaran Projek Oleh PO Pusat	-
Tarikh Pendaftaran Projek	01-05-2018
Tarikh Pendaftaran Projek (Selepas mansuh)	-
RM Wujud Projek	11
RM Semasa Projek	11
Rancangan Malaysia	RMK11 Bukan Rolling Plan
Kategori Projek	Persekutuan dilaksanakan secara Pakej
Penolong Pengurus Program	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
Pejabat HOPT	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)
Skop Projek	PEMBAIKAN CERUN
Maksud Pembangunan	B
Wakil/Pengurus Program	CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)
Pejabat Pelanggan	KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
Kos Projek Asal	RM 2,500,000.00
Kos Projek Semasa	RM 2,500,000.00
Kaedah Perlaksanaan	Sah Terkini : Konvensional (Dalamana) Pindaan Semasa : Tiada
Jenis Perolehan	Sah Terkini : Tender Terbuka Pindaan Semasa : Tiada
Integrasi Primavera	Tiada

Interaksi QPlan, DPlan & CPlan

Bil	Pejabat Tanggungjawab	QPlan			DPlan			CPlan		
		Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah

1. Perancangan

- 1.1 Catatan Projek
 - Tambah Catatan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN \(CERUN\)](#)
 - Senarai Catatan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN \(CERUN\)](#)
 - Kepilan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN \(CERUN\)](#)
 - Senarai Kepilan Projek: ditugaskan kepada [CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN \(CERUN\)](#)
- 1.2 Strategi Pelaksanaan
 - [Senarai Pindaan Strategi Pelaksanaan Projek](#)
 - Pindaan Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada [Ramlan b. Abdul Razak](#) dari [CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN \(CERUN\)](#)
 - Cetak Strategi Pelaksanaan: ditugaskan kepada [Ramlan b. Abdul Razak](#) dari [CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN \(CERUN\)](#)
- 1.3 Pejabat Bertanggungjawab Bagi Kewangan Projek
 - Pejabat Bertanggungjawab Bagi Kewangan Projek: ditugaskan kepada [UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH \(CERUN\)](#)
- # Peringkat Projek
 - Rancang Kewangan Projek: Pejabat Belum Ditentukan
 - Peruntukan Projek: Pejabat Belum Ditentukan
 - Perbelanjaan Projek: Pejabat Belum Ditentukan
- # Peringkat Negeri
 - Rancang Kewangan Projek Negeri: Pejabat Belum Ditentukan
 - Peruntukan Projek Negeri: Pejabat Belum Ditentukan
 - Perbelanjaan Projek Negeri: Pejabat Belum Ditentukan
- 1.4 Pelan Kualiti Projek
 - Pindaan Versi Q-Plan ditugaskan kepada [KAMAL BAHRIN BIN JAAFAR \(HOPT\)](#): ditugaskan kepada [UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH \(CERUN\)](#)
 - Senarai Cetak Versi QPlan: ditugaskan kepada [UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH \(CERUN\)](#)

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

- 4.1 Catatan Kontrak
 - Tambah Catatan Kontrak: ditugaskan kepada [JKR\(D\) KAMPAR \(PRK\)](#)
 - Kepilan Kontrak: ditugaskan kepada [JKR\(D\) KAMPAR \(PRK\)](#)

ALIRAN KERJA – Fasa Pembinaan

Interaksi QPlan, DPlan & CPlan

Bil	Pejabat Tanggungjawab	QPlan			DPlan			CPlan				
		Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah		
1.	HOPT : UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)											
	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk QPlan											
	08-05-2019											
2.	Cerun HODT : UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN) 23-05-2018 sehingga 30-04-2019											
3.	WAKIL PEGAWAI PENGUASA											
NOTA: Tarikh maksimum DPlan Mekanikal & Elektrikal yang dilaksanakan secara NSC diambil dari Bahagian 1: Komponen Rekabentuk dalam DPlan.												

Jadual Aktiviti Projek

Aktiviti Aliran Kerja Pejabat Bertanggungjawab	Jangka Laksana	Pindaan Semasa	Sah Sebenar
Perancangan			
Penerimaan & Pendaftaran Projek CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	01-05-2018	01-05-2018	01-05-2018
Sah Brif Projek UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	22-05-2018	22-05-2018	22-05-2018
Rekabentuk			
Penyerahan Lukisan Cerun Kepada HOPT UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	01-05-2019	01-05-2019	16-05-2019
Penyerahan Lukisan Lengkap Tender Oleh HOPT UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	08-05-2019	08-05-2019	21-05-2019
Penerimaan Set Lukisan Lengkap Dari HOPT UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	09-05-2019	09-05-2019	24-05-2019
Perolehan			
Tarikh Iklan UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	17-09-2019	17-09-2019	26-06-2019
Surat Kepada Lembaga Tender UNIT UKUR BAHAN (CERUN)	20-11-2019	20-11-2019	04-12-2019
Makluman keputusan Lembaga Tender UNIT UKUR BAHAN (CERUN)	18-12-2019	18-12-2019	20-12-2019
Surat Setuju Terima UNIT UKUR BAHAN (CERUN)	15-01-2020	15-02-2020	30-12-2019
Pembinaan			

2. Rekabentuk

3. Perolehan

4. Pembinaan

4.1 Catatan Kontrak

- Tambah Catatan Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
- Kepilan Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.2 Pejabat JKR 66

- Penentuan Semula Pejabat JKR 66: ditugaskan kepada UNIT UKUR BAHAN (CERUN)

4.3 Penentuan Pegawai Yang Memperakukan JKR66 oleh Pejabat Yang Mengendalikan JKR66

- Sila pilih Nama Pegawai Yang Diberi Kuasa bagi memperakukan Bayaran JKR66 dalam Sistem SKALA.
- Pilih / Penentuan Semula Pegawai Yang Memperakukan JKR66: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.4 Penentuan Pejabat Yang Mengesahkan Bayaran JKR66 (Bahagian Kewangan)

- Pilih / Penentuan Semula Pejabat Bahagian Kewangan: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.5 Penentuan Pejabat-pejabat Pelaksana/Bertanggungjawab Bagi Selia Tapak. (Diisi setelah surat kuasa perantikan PP/PD/WPP/PPD dikeluarkan)

- Penentuan Pejabat Selia Tapak: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.6 Bayaran Pendahuluan (Tindakan Peg.Pengesyor)

- Sedia Bayaran Pendahuluan Oleh Pegawai Pengesyor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.7 Bayaran Pendahuluan(Tindakan Peg.Yg Memperakukan)

- Cetak Bayaran Pendahuluan oleh Pegawai Yang Memperakukan: Tiada Bayaran Pendahuluan Untuk Tindakan Pegawai Yang Memperakukan

4.8 Pengesahan Bayaran Pendahuluan Oleh Bahagian Kewangan

- Sedia Pengesahan Bayaran Pendahuluan: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.9 CPlan

- Sedia Pindaan Versi CPlan: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
- Senarai Cetak CPlan: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.10 Rancang Kewangan Kontrak (RKK)

- Sedia Rancang Kewangan Kontrak: Rancang Kewangan Kontrak boleh disediakan sekiranya ada perubahan ke atas APK/PHK/EOT/CPC.
- Senarai Cetak RKK: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.11 Rancang Kemajuan Fizikal (RKF)

- Sedia Rancang Kemajuan Fizikal (RKF): ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
- Senarai Cetak RKF: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.12 Kemajuan Kerja Fizikal (KKF)

ALIRAN KERJA – Fasa Pembinaan

UNIT UKUR BAHAN (CERUN)			
Pembinaan			
Perakuan Siap Kerja JKR(D) KAMPAR (PRK)	14-01-2021	07-05-2021	Belum Dilaksanakan
Penyerahan			
Penyerahan Projek Kepada Pelanggan JKR(D) KAMPAR (PRK)	17-03-2021	13-08-2021	Belum Dilaksanakan
Perakuan Baik Kecacatan JKR(D) KAMPAR (PRK)	17-03-2022	12-05-2022	Belum Dilaksanakan

Maklumat Gerbang Nilai

Jenis	Tarikh Penilaian	Keputusan Penilaian	Senarai Cetak
Gerbang Nilai 1	22-05-2018	HIJAU	Senarai Cetak Gerbang Nilai 1
Gerbang Nilai 2	03-07-2018	HIJAU	Senarai Cetak Gerbang Nilai 2
Gerbang Nilai 3	25-07-2018	HIJAU	Senarai Cetak Gerbang Nilai 3
Gerbang Nilai 4	Belum Disediakan		

Maklumat Gerbang Nilai (Versi Lama)

Jenis	Tarikh Penilaian	Keputusan Penilaian	Senarai Cetak
Gerbang Nilai 2 : Kesiediaan Untuk Rekabentuk		Tiada Maklumat	
Gerbang Nilai 3 : Kesiediaan Untuk Tender		Tiada Maklumat	
Gerbang Nilai 4 : Kesiediaan Untuk Perkhidmatan		Tiada Maklumat	

Maklumat Asas Kontrak

Tajuk Kontrak	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG, PERAK.
Kontraktor	BINA ALAM VENTURES SDN BHD
No Kontrak	JKR/PERS/CKC/031/2019
Pengawai Penguasa	Jurutera Daerah Kampar (PRK)
Tarikh Milik Tapak	16-01-2020
Tarikh Siap Asal	13-01-2021
Tarikh Siap Semasa	07-05-2021
Tarikh Siap Sebenar	-
Harga Kontrak Asal	RM 2,237,863.00
Harga Kontrak Semasa	RM 1,747,643.00
% Kemajuan Kerja Fizikal	39.00% (sehingga 15-01-2021)
% Jadual Kerja Fizikal	82.19% (sehingga 15-01-2021)
Kemajuan Kerja Fizikal	110 hari Lewat (sehingga 15-01-2021)
Tarikh Mula Jaminan Wang Pendahuluan	-
Tarikh Tamat Awal Jaminan Wang Pendahuluan	-

4.12	Kemajuan Kerja Fizikal (KKF) - Sedia Kemajuan Kerja Fizikal (KKF): ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Senarai Cetak Kemajuan Kerja Fizikal (KKF): ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.13	Supplementary Agreement Sedia Supplementary Agreement: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.14	Arahan Perubahan Kerja - Sedia Arahan Perubahan Kerja: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Senarai Cetak APK: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.15	Pelarasan Harga Kontrak - Sedia Pelarasan Harga Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Sah Pelarasan Harga Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.16	Surat Pelarasan Kenaan GST - Cetak Surat Pelarasan Kenaan GST: ditugaskan kepada UNIT UKUR BAHAN (CERUN) - Sedia Surat Pelarasan Kenaan GST: ditugaskan kepada UNIT UKUR BAHAN (CERUN) - Sah Surat Pelarasan Kenaan GST: ditugaskan kepada UNIT UKUR BAHAN (CERUN)
4.17	Surat Perakuan Penukaran Bon Pelaksanaan Daripada Wang Jaminan Pelaksanaan Kepada Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Insurans Sedia Surat Perakuan Penukaran Bon Pelaksanaan Daripada Wang Jaminan Pelaksanaan Kepada Jaminan Bank/Syarikat Kewangan/Insurans: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.18	Bayaran Interim (Tindakan Peg.Pengesyor) - Sedia Bayaran Interim Oleh Pegawai Pengesyor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Senarai Cetak Bayaran: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.19	Bayaran Interim (Tindakan Peg.Yg Memperakukan) - Cetak Bayaran Interim oleh Pegawai Yang Memperakukan: Tiada Bayaran Interim Untuk Tindakan Pegawai Yang Memperakukan - Pinda / Sah Bayaran Interim: Sila cetak bayaran interim terlebih dahulu
4.20	Pengesahan Bayaran Interim Oleh Bahagian Kewangan - Sedia Pengesahan Bayaran Interim: Tiada bayaran interim yang diterima untuk disahkan bayaran - Sah Pengesahan Bayaran Interim: Tiada bayaran interim yang diterima untuk disahkan bayaran - Senarai Cetak Pengesahan Bayaran Interim: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.21	Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (EOT) - Sedia Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (EOT) No. 2: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Senarai Cetak EOT: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.22	Prestasi Kontraktor Sedia Prestasi Kontraktor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)

ALIRAN KERJA – Fasa Pembinaan

Gerbang Nilai 2 : Kesiediaan Untuk Rekabentuk	Tiada Maklumat
Gerbang Nilai 3 : Kesiediaan Untuk Tender	Tiada Maklumat
Gerbang Nilai 4 : Kesiediaan Untuk Perkhidmatan	Tiada Maklumat

Maklumat Asas Kontrak

Tajuk Kontrak	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH BERA SRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG, PERAK.
Kontraktor	BINA ALAM VENTURES SDN BHD
No Kontrak	JKR/PERS/CKC/031/2019
Pengawai Penguasa	Jurutera Daerah Kampar (PRK)
Tarikh Milik Tapak	16-01-2020
Tarikh Siap Asal	13-01-2021
Tarikh Siap Semasa	07-05-2021
Tarikh Siap Sebenar	-
Harga Kontrak Asal	RM 2,237,863.00
Harga Kontrak Semasa	RM 1,747,643.00
% Kemajuan Kerja Fizikal	39.00% (sehingga 15-01-2021)
% Jadual Kerja Fizikal	82.19% (sehingga 15-01-2021)
Kemajuan Kerja Fizikal	110 hari Lewat (sehingga 15-01-2021)
Tarikh Mula Jaminan Wang Pendahuluan	-
Tarikh Tamat Asal Jaminan Wang Pendahuluan	-
Tarikh Tamat Semasa Jaminan Wang Pendahuluan	-
Tarikh Mula Bon Pelaksanaan	-
Tarikh Tamat Asal Bon Pelaksanaan	-
Tarikh Tamat Semasa Bon Pelaksanaan	-
Pejabat Yang Menyediakan SST	UNIT UKUR BAHAN (CERUN)
Pejabat Seliatapak	JKR(D) KAMPAR (PRK)
Pejabat Yang Mengendalikan JKR66	JKR(D) KAMPAR (PRK)
Pejabat Bahagian Kewangan	JKR(D) KAMPAR (PRK)
Nama Pegawai Yang Memperakukan JKR66	Ir. AHMAD ALLNADHOR BIN HAMIM
Pejabat Pegawai Yang Memperakukan JKR66	JKR(D) KAMPAR (PRK)

4.18	Bayaran Interim (Tindakan Peg.Pengesyor) - Sedia Bayaran Interim Oleh Pegawai Pengesyor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Senarai Cetak Bayaran: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.19	Bayaran Interim (Tindakan Peg.Yg Memperakukan) - Cetak Bayaran Interim oleh Pegawai Yang Memperakukan: Tiada Bayaran Interim Untuk Tindakan Pegawai Yang Memperakukan - Pinda / Sah Bayaran Interim: Sila cetak bayaran interim terlebih dahulu
4.20	Pengesahan Bayaran Interim Oleh Bahagian Kewangan - Sedia Pengesahan Bayaran Interim: Tiada bayaran interim yang diterima untuk disahkan bayaran - Sah Pengesahan Bayaran Interim: Tiada bayaran interim yang diterima untuk disahkan bayaran - Senarai Cetak Pengesahan Bayaran Interim: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.21	Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (EOT) - Sedia Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa (EOT) No. 2: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Senarai Cetak EOT: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.22	Prestasi Kontraktor Sedia Prestasi Kontraktor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.23	Notis Untuk Tujuan Penamatan Kontraktor - Sedia Notis Untuk Tujuan Penamatan Kontraktor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Sah Notis Untuk Tujuan Penamatan Kontraktor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.24	Notis Penamatan Kerja Kontraktor (Mansuh) Sedia Notis Penamatan Kerja Kontraktor: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.25	Perakuan Kerja Tak Siap (LAD) - Cetak Perakuan Kerja Tak Siap (LAD): ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK) - Sedia Perakuan Kerja Tidak Siap: ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
4.26	Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) - Cetak Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC): - Sedia Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC): ditugaskan kepada JKR(D) KAMPAR (PRK)
5. Penyerahan	



MENGENAI SKALA | MAKLUMBALAS | SELENGGARA

Sekiranya terdapat sebarang ulasan/pertanyaan sila hubungi : skala@jkr.gov.my atau telefon 03-26108512 / 03-26108224 / 03-26108305
© Hakmilik 1985 - 2021 Bahagian Teknologi Maklumat, Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya, Malaysia

ALIRAN KERJA – Fasa Penyerahan

Kaedah Perlaksanaan	Sah Terkini : Konvensional (Dalam)
Jenis Perolehan	Pindaan Semasa : Tiada
Integrasi Primavera	Sah Terkini : Tender Terhad
	Pindaan Semasa : Tiada
	Tiada

Interaksi QPlan, DPlan & CPlan

Bil	Pejabat Tanggungjawab		QPlan			DPlan			CPlan		
			Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah
1.	HOPT : BHG. BANGUNAN (TRG)										
	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk QPlan				✓						
	07-03-2019		Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk DPlan			04-03-2019					
2.	Senibina HODT : BHG. ARKITEK (TRG) 14-02-2019 sehingga 18-02-2019							✓			
3.	Mekanikal HODT : BHG. MEKANIKAL (TRG) 14-02-2019 sehingga 25-02-2019							✓			
4.	Elektrikal HODT : BHG. ELEKTRIK (TRG) 14-02-2019 sehingga 19-02-2019							✓			
5.	Ukur Bahan HODT : BHG. KONTRAK & U/BAHAN (TRG) 14-02-2019 sehingga 04-03-2019							✓			
6.	WAKIL PEGAWAI PENGUASA										✓

NOTA: Tarikh maksimum DPlan Mekanikal & Elektrikal yang dilaksanakan secara NSC diambil dari Bahagian 1: Komponen Rekabentuk dalam DPlan.

Jadual Aktiviti Projek

Aktiviti Aliran Kerja Pejabat Bertanggungjawab	Jangka Laksana	Pindaan Semasa	Sah Sebenar
Perancangan			
Penerimaan & Pendaftaran Projek JKR NEGERI TERENGGANU (TRG)	10-02-2019	10-02-2019	10-02-2019
Sah Brif Projek BHG. BANGUNAN (TRG)	14-02-2019	14-02-2019	14-02-2019
Rekabentuk			
Penyerahan Lukisan Senibina Kepada HOPT BHG. ARKITEK (TRG)	18-02-2019	18-02-2019	18-02-2019
Penyerahan Maklumat Awalan Mekanikal Kepada HOPT BHG. MEKANIKAL (TRG)	25-02-2019	25-02-2019	25-02-2019
Penyerahan Maklumat Awalan Elektrikal Kepada HOPT BHG. ELEKTRIK (TRG)	25-02-2019	25-02-2019	25-02-2019
Penyerahan Dokumen Ukur Bahan Kepada HOPT BHG. KONTRAK & U/BAHAN (TRG)	04-03-2019	04-03-2019	04-03-2019
Penyerahan Lukisan Lengkap Tender Oleh HOPT BHG. BANGUNAN (TRG)	07-03-2019	07-03-2019	07-03-2019
Penerimaan Set Lukisan Lengkap Dari HOPT	08-03-2019	08-03-2019	08-03-2019

2. Rekabentuk	
3. Perolehan	
4. Pembinaan	
5. Penyerahan	
5.1	Catatan Kontrak - Tambah Catatan Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG) - Keputusan Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.2	Pejabat JKR 66 Penentuan Semula Pejabat JKR 66: ditugaskan kepada BHG. KONTRAK & U/BAHAN (TRG)
5.3	Penentuan Pegawai Yang Memperakukan JKR66 oleh Pejabat Yang Mengendalikan JKR66 Sila pilih Nama Pegawai Yang Diberi Kuasa bagi memperakukan Bayaran JKR66 dalam Sistem SKALA. Pilih / Penentuan Semula Pegawai Yang Memperakukan JKR66: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.4	Penentuan Pejabat Yang Mengesahkan Bayaran JKR66 (Bahagian Kewangan) Pilih / Penentuan Semula Pejabat Bahagian Kewangan: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.5	CPlan - Sedia Pindaan Versi CPlan: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG) - Senarai Cetak CPlan: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.6	Rancang Kewangan Kontrak (RKK) Senarai Cetak RKK: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.7	Arahan Perubahan Kerja - Sedia Arahan Perubahan Kerja: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG) - Senarai Cetak APK: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.8	Pelarasan Harga Kontrak - Sedia Pelarasan Harga Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG) - Sah Pelarasan Harga Kontrak: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG) - Senarai Cetak PHK: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.9	Bayaran Interim (Tindakan Peg.Pengesyor) - Sedia Bayaran Interim Oleh Pegawai Pengesyor: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG) - Senarai Cetak Bayaran: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.10	Bayaran Interim (Tindakan Peg.Yg Memperakukan) - Cetak Bayaran Interim oleh Pegawai Yang Memperakukan: Tiada Bayaran Interim Untuk Tindakan Pegawai Yang Memperakukan - Pinda / Sah Bayaran Interim: Sila cetak bayaran interim terlebih dahulu
5.11	Penyata Akaun Mukhtamad (SOFA) Sedia Penyata Akaun Mukhtamad (SOFA): Penyata Akaun Mukhtamad (SOFA) telah disahkan dalam SKALA
5.12	Surat Pelepasan Wang Jaminan Pelaksanaan Bhg.2 Sedia Surat Pelepasan Wang Jaminan Pelaksanaan Bhg.2: ditugaskan kepada JKR(D) BESUT (TRG)
5.13	Penyata Akaun Mukhtamad (Tindakan Peg.Pengesyor)

BUTIRAN PROJEK

PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH BERA SRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG, PERAK.

Strategi Pelaksanaan				
Butiran Strategi Pelaksanaan	Kaedah Pelaksanaan / Jenis Perolehan Konvensional (Dalamam) / Tender Terbuka	ACAT 5	Rancangan Malaysia Ke (RMK) RMK11 Bukan Rolling Plan	
Pelanggan / Pejabat Bertanggungjawab	Pelanggan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)	HPO Ramlan b. Abdul Razak	Pengurus Program CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	Pegawai Penyedia Surat Pendaftaran Projek Zuikify Bin A.Ghani
Kos Projek	Kos Projek Asal Yang Diberikan Kepada JKR 2,500,000.00	Siling Asal RMK Mengikut Rolling Plan Semasa Yang Didaftar 2,500,000.00		
Jadual Tarikh Pelaksanaan	Tarikh Daftar Strategi Pelaksanaan 30-04-2018	Tarikh Jangka Mula Pembinaan 06-12-2019	Tarikh Jangka Siap Pembinaan 27-11-2020	Tarikh Jangka Serahan Kepada Pelanggan 26-02-2021
Tarikh Terima	Brif 22-03-2018	Tapak 22-03-2018	Siling 01-05-2019	

Butiran Projek						
Butiran Projek Persekutuan	Kaedah Pelaksanaan / Jenis Perolehan / Kategori IBS Konvensional (Dalamam) / Tender Terbuka / Bukan IBS	Jenis Rekabentuk (PAP/Baru/Piawai)/ Jenis Rekabentuk BIM (BIM/Tanpa BIM) Piawai / Tanpa BIM	Rujukan Skala SKL0201/B18/27363/21206/17979/TB/KD	Rujukan SPPII Tiada	Lokasitapak Kampar	Penarafan Hijau (PH) Tiada
Pelanggan / Pejabat Bertanggungjawab	Pelanggan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)	Pengurus Program CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	Penolong Pengurus Program CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	Pejabat HOPT UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	Nama HOPT KAMAL BAHRIN BIN JAAFAR	
Kos Projek	Kos Projek Semasa RM 2,500,000.00	Siling Projek Semasa RM 2,500,000.00	Unjuran Projek Tahun 2021 RM 378,041.54	Peruntukan Diterima Tahun 2021 RM 0.00	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2021 RM 0.00	
Tarikh Lulus	Muktamad Skop 21-05-2018	Mengesah Kesesuaian Tapak 22-05-2018	Anggaran Kos Awalan(AKA) 22-05-2019	Tarikh Capai Kategori 3 22-05-2019		
	Catatan: -	Catatan: -	Catatan: -			

Catatan Projek

Tiada

Catatan HODT

Tiada

Kepilan Projek

DOKUMEN PELAN PENGURUSAN RISIKO

BUTIRAN PROJEK

Catatan Projek

Tiada

Kepilan Projek

Kepilan Projek

Tiada

Maklumat Gerbang Nilai

Jenis	Tarikh Penilaian	Keputusan Penilaian	Senarai Cetak
Gerbang Nilai 1	22-05-2018	HIJAU	Senarai Cetak Gerbang Nilai 1
Gerbang Nilai 2	03-07-2018	HIJAU	Senarai Cetak Gerbang Nilai 2
Gerbang Nilai 3	25-07-2018	HIJAU	Senarai Cetak Gerbang Nilai 3
Gerbang Nilai 4	Belum Disediakan		

Maklumat Projek Tangguh

Tiada

Catatan HODT

Tiada


DOKUMEN PELAN PENGURUSAN RISIKO

- [KEPILAN RMP ASAL](#)
- [KEPILAN RMP PINDAAN](#)
- [Selenggara - MUAT NAIK KEPILAN RMP ASAL](#)
- [Selenggara - MUAT NAIK KEPILAN RMP PINDAAN](#)

Maklumat Gerbang Nilai (Versi Lama)

Jenis	Tarikh Penilaian	Keputusan Penilaian	Senarai Cetak
Gerbang Nilai 2 : Kesiediaan Untuk Rekabentuk		Tiada Maklumat	
Gerbang Nilai 3 : Kesiediaan Untuk Tender		Tiada Maklumat	
Gerbang Nilai 4 : Kesiediaan Untuk Perkhidmatan		Tiada Maklumat	

Jadual Aktiviti Pelaksanaan (QPlan)

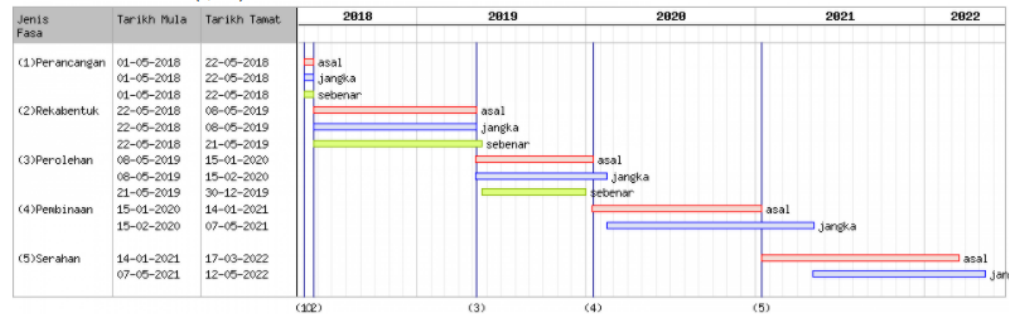

Jadual Aktiviti Projek

Aktiviti Aliran Kerja Pejabat Bertanggungjawab	Jangka Laksana	Pindaan Semasa	Sah Sebenar
Perancangan			

BUTIRAN PROJEK

Jadual Aktiviti Projek

Aktiviti Aliran Kerja Pejabat Bertanggungjawab	Jangka Laksana	Pindaan Semasa	Sah Sebenar
Perancangan			
Penerimaan & Pendaftaran Projek CAWANGAN KEJURUTERAAN CERUN (CERUN)	01-05-2018	01-05-2018	01-05-2018
Sah Brif Projek UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	22-05-2018	22-05-2018	22-05-2018
Rekabentuk			
Penyerahan Lukisan Cerun Kepada HOPT UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	01-05-2019	01-05-2019	16-05-2019
Penyerahan Lukisan Lengkap Tender Oleh HOPT UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	08-05-2019	08-05-2019	21-05-2019
Penerimaan Set Lukisan Lengkap Dari HOPT UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	09-05-2019	09-05-2019	24-05-2019
Perolehan			
Tarikh Iklan UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)	17-09-2019	17-09-2019	26-06-2019
Surat Kepada Lembaga Tender UNIT UKUR BAHAN (CERUN)	20-11-2019	20-11-2019	04-12-2019
Makluman keputusan Lembaga Tender UNIT UKUR BAHAN (CERUN)	18-12-2019	18-12-2019	20-12-2019
Surat Setuju Terima UNIT UKUR BAHAN (CERUN)	15-01-2020	15-02-2020	30-12-2019
Pembinaan			
Perakuan Siap Kerja JKR(D) KAMPAR (PRK)	14-01-2021	07-05-2021	Belum Dilaksanakan
Penyerahan			
Penyerahan Projek Kepada Pelanggan JKR(D) KAMPAR (PRK)	17-03-2021	13-08-2021	Belum Dilaksanakan
Perakuan Baik Kekacatan JKR(D) KAMPAR (PRK)	17-03-2022	12-05-2022	Belum Dilaksanakan

Interaksi QPlan, DPlan & CPlan

Bil	Pejabat Tanggungjawab	QPlan			DPlan			CPlan		
		Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah	Sedia	Pinda	Sah
1.	HOPT : UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)									
	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk QPlan	Tarikh Siap Maksimum Rekabentuk DPlan								
	08-05-2019	30-04-2019								
2.	CERUN HODT : UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN) 23-05-2018 sehingga 30-04-2019									
3.	WAKIL PEGAWAI PENGUASA									

NOTA: Tarikh maksimum DPlan Mekanikal & Elektrikal yang dilaksanakan secara NSC diambil dari Bahagian 1: Komponen Rekabentuk dalam DPlan.

BUTIRAN KONTRAK



| Norazura Bt Atan dari CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

19/01/2021 | [LOG KELUAR](#)

[LAMAMAN UTAMA](#) [ALIRAN KERJA](#) [LAPORAN](#)

Taip di sini untuk carian [Projek](#) [Kontrak](#) [Kontraktor](#)

[Kontrak](#) → Butiran Kontrak

[Aliran Kerja](#) [Butiran Projek](#) [Butiran Kontrak](#) [Senarai Cetak Pdf](#) [Gambar Projek](#) [Tuntutan / CCP](#)

[Hapus Projek](#) [Pembatalan Projek \(HOPT\)](#) [History](#) [States](#) [Maklumbalas \(3\)](#) [Kemaskini Capaian i-Supervision](#)

PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG, PERAK.

Catatan Kontrak

Kemajuan di tapak bina sehingga 15.01.2021 : (S)=39.00% / (J)=82.19% : (1) Kerja-kerja RC Bench di Zon 3 & Zon 4. (2) Kerja-kerja Reinforced Earth di Area 1. (3) Kerja-kerja Horizontal Drain di Zon 1 dan Zon 2. (4) Mesyuarat Tapak No.8 telah dijalankan pada 12/01/2021.

15-01-2021
Pegawai Seliatapak
JKR(D) KAMPAR (PRK)

[Catatan
Sebelumnya >>](#)

Maklumat Asas Kontrak

Tajuk	PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG, PERAK.
Rujukan SKALA	SKL0201/B18/27363/21206/17979/TB/KD
Kategori IBS	Bukan IBS
Kontraktor	BINA ALAM VENTURES SDN BHD
Rujukan PKK	
Rujukan ROC	1142949
No. GST	
Gred	G4
No. Kontrak	JKR/PERS/CKC/031/2019
Pegawai Penguasa	Jurutera Daerah Kampar (PRK)

Maklumat Kerja

Tarikh Milik Tapak	16-01-2020
Tarikh Siap Asal	13-01-2021
Tarikh Siap Semasa (Ikut Kontrak)	07-05-2021
% Jadual Kerja Fizikal	82.19% (sehingga 15-01-2021)
% Kemajuan Kerja Fizikal	39.00% (sehingga 15-01-2021)
Kemajuan Kerja Fizikal	110 hari Lewat (sehingga 15-01-2021)

Maklumat Siap / Mansuh

Tarikh Siap Sebenar (CPC)	-
Tarikh Terima Lukisan Siap Bina	-
Tarikh Patut CMGD (3bulan 14hari selepas Tarikh Tamat Tempoh Kecacatan)	-
Tarikh Mansuh	-
Tarikh Notis bagi Tujuan Mansuh	-
Tarikh Patut Keluar Penyata Akaun Muktamad (SOFA) (6 Bulan Selepas Tarikh Siap Sebenar (CPC))	-
Tarikh Penyata Akaun Muktamad (SOFA)	-
Tarikh Patut Keluar Perakuan JKR66A (Bayaran Muktamad) (3Bulan Selepas Tarikh Sebenar Sempurna Baik Kecacatan)	-
Tarikh Perakuan JKR66A (Bayaran Muktamad)	-
Tarikh EFT Bayaran Akhir	-
Kos Bayaran Muktamad Kontrak	-

Maklumat Pra-Kontrak

Tarikh Dijadualkan Tender	17-09-2019
Tarikh Tender	26-06-2019
Nombor Tender	JKR/Caw, Kejuruteraan Cerun (CERUN)/21206/2019
Tarikh Dijadualkan Keluar SST	15-02-2020
Tarikh Surat SST	30-12-2019
Tarikh Tandatangan Dokumen Kontrak	14-02-2020

Maklumat Kewangan

% Nilai Kerja Berbanding Kontrak	26.8%
% Unjuran Berbanding Kontrak	72.5%
% Jumlah Amaun Yang di Bayar Hingga Kini Berbanding Kontrak	26.3%
Peruntukan Diluluskan	RM 0.00
Peruntukan Tahun Semasa	RM 0.00
ATDA Asal	RM 2,500,000.00
Harga Kontrak Asal	RM 2,237,863.00
Harga Kontrak Semasa	RM 1,747,643.00
Nilai Kerja Dilaksanakan Hingga Kini	RM 467,663.54
Unjuran Perbelanjaan Kini	RM 1,267,848.37
Jumlah Amaun Bayaran Interim Yang DiBayar Hingga Kini (Pengesahan Bayaran Oleh Bhg. Kewangan)	RM 458,900.00
Bayaran Pendahuluan Yang Diperakukan Dlm JKR66	RM 0.00
Jumlah Amaun Yang di Bayar Hingga Kini	RM 458,900.00
Bayaran Balik Wang Pendahuluan (Recoupment)	RM 0.00
Tarikh Mula Jaminan Wang Pendahuluan	-
Tarikh Tamat Asal Jaminan Wang Pendahuluan	-
Tarikh Tamat Semasa Jaminan Wang Pendahuluan	-
Tarikh Mula Bon Pelaksanaan	-
Tarikh Tamat Asal Bon Pelaksanaan	-
Tarikh Tamat Semasa Bon Pelaksanaan	-
Peratusan Wang Jaminan Perlaksanaan Terkumpul	41.01%
Peratusan Pelepasan Wang Jaminan Perlaksanaan (WJP)	0.00%

Maklumat Lain-Lain

Butiran Bayaran	Unjuran Bulanan
Graf Kemajuan Kerja Fizikal	
Maklumat	Maklumat Terkini LAD
APK(2) PHK PHK SA EOT(1)	Setakat ini tiada denda dikenakan

BUTIRAN KONTRAK

Tarikh Siap Bina (S/B)

Tarikh Terima Lukisan Siap Bina

Tarikh Patut CMGD (3bulan 14hari selepas Tarikh Tamat Tempoh Kecacatan)

Tarikh Mansuh

Tarikh Notis bagi Tujuan Mansuh

Tarikh Patut Keluar Penyata Akaun Muktamad (SOFA) (6 Bulan Selepas Tarikh Siap

Sebenar (CPC))

Tarikh Penyata Akaun Muktamad (SOFA)

Tarikh Patut Keluar Perakuan JKR66A (Bayaran Muktamad) (3Bulan Selepas Tarikh

Sebenar Sempurna Baik Kecacatan)

Tarikh Perakuan JKR66A (Bayaran Muktamad)

Tarikh EFT Bayaran Akhir

Kos Bayaran Muktamad Kontrak

Tempoh Kecacatan

Tarikh Sebenar Sempurna Baik Kecacatan

Bayaran Lima Kali Terakhir

JKR66			Pengesahan Bayaran Oleh Bahagian Kewangan	
Tarikh Bayaran Penilaian	Amaun Bayaran (RM)	Jenis Bayaran Catatan	Tarikh Bayaran Dibuat (EFT)	Jumlah Amaun Yang Dibayar Oleh Bhg Kewangan (RM)
22-12-2020	RM 8,700.00	Bayaran Interim No 12	-	RM 0.00
16-11-2020	RM 87,900.00	Bayaran Interim No 11	23-11-2020	RM 87,900.00
03-11-2020	RM 66,500.00	Bayaran Interim No 10	13-11-2020	RM 66,500.00
13-10-2020	RM 78,300.00	Bayaran Interim No 9	13-10-2020	RM 78,300.00
29-09-2020	RM 21,000.00	Bayaran Interim No 8	12-10-2020	RM 21,000.00

[Butiran Bayaran](#)

[Butiran Pengesahan Bahagian Kewangan](#)

[Catatan Bahagian Kewangan](#)

Nama Pegawai Yang Memperakukan JKR66 : Ir. AHMAD ALLNADHOR BIN HAMIM

Pejabat: JKR(D) KAMPAR (PRK)

Maklumat Prestasi Kontraktor

Kualiti	Gred
Kualiti Urus Tapak	-
Kualiti Mentadbir	-
Kualiti Merancang	-
Kualiti Kemudahan	-
Kualiti Struktur	-
Kualiti Kemasan	-
Kualiti Kerja Luar	-
Kualiti Awasi NSC Pembekal	-

Catatan : -

Tarikh Penilaian : -

Maklumat Prestasi Kontraktor (Keselamatan Dan Kesihatan Perkerjaan Di Tapak Bina)

Kualiti	Gred
Pengurusan OSH (Organisation & Management)	-
Perancangan S-Plan, HIRADC, ERP (Planning)	-

Maklumat Lain-Lain

Butiran Bayaran	Unjuran Bulanan
Graf Kemajuan Kerja Fizikal	
Maklumat	
APK(2) PHK PHK SA EOT(1) Supplementary Agreement Maklumat Perubahan Tarikh dan Harga Semasa Notis Untuk Tujuan Penamatan Kontraktor	Setakat ini tiada denda dikenakan

Pejabat Bertanggungjawab

Pejabat	Tanggungjawab
PEJABAT HOPT	UNIT FORENSIK TANAH RUNTUH (CERUN)
PEJABAT YANG MENYEDIAKAN SST	UNIT UKUR BAHAN (CERUN)
PEJABAT YANG MENYEDIAKAN CPC	JKR(D) KAMPAR (PRK)
PEJABAT YANG MENGENDALIKAN JKR 66	JKR(D) KAMPAR (PRK)
PEJABAT YANG MELAKSANAKAN SERAHAN	JKR(D) KAMPAR (PRK)
PEJABAT YANG MENYEDIAKAN DLP	JKR(D) KAMPAR (PRK)
PEJABAT BAHAGIAN KEWANGAN	JKR(D) KAMPAR (PRK)

Pegawai Bertanggungjawab

Tanggungjawab	Nama	Jawatan	Pejabat
PP	Ir. AHMAD ALLNADHOR BIN HAMIM	JURUTERA DAERAH	JKR(D) KAMPAR (PRK)
WPP	Tajul Firdaus Bin Tajul Mulok	Jurutera Awam (Bangunan)	JKR(D) KAMPAR (PRK)

Kepilan, Senarai Cetak QPlan & CPlan

Kepilan Kontrak	Tiada
Q-Plan	Cetak PDF Q-Plan
C-Plan	Cetak PDF CPlan
Kepilan Lukisan Siap Bina	Tiada

Selenggara Projek/Subprojek/Kontrak

- [Delete Bayaran Interim/JKR 66](#)
 - [Kemaskini blocking interim](#)
 - [Delete SST](#)
 - [Kemaskini Jenis Pembayar](#)
- Tarikh/masa Kemaskini Projek:2021-01-15 12:53:12.710049

GAMBAR PROJEK – i-Supervision



| Norazura Bt Atan dari CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

19/01/2021 | [LOG KELUAR](#)

[LAMAN UTAMA](#)

[ALIRAN KERJA](#)

[LAPORAN](#)

Taip di sini untuk carian

[Projek](#)

[Kontrak](#)

[Kontraktor](#)

PROJEK PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG, PERAK.

Gambar Projek (2)

[Tambah Gambar](#)



[MENGENAI SKALA](#) | [MAKLUMBALAS](#) | [SELENGGARA](#)

Sekiranya terdapat sebarang ulasan/pertanyaan sila hubungi : skala@jkr.gov.my atau telefon 03-26108512 / 03-26108224 / 03-26108305
© Hakmilik 1985 - 2021 Bahagian Teknologi Maklumat, Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya, Malaysia

SENARAI CETAK



| Norazura Bt Atan dari CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

19/01/2021

LOG KELUAR

LAMAN UTAMA

ALIRAN KERJA

LAPORAN

Taip di sini untuk carian

Projek

Kontrak

Kontraktor

[Projek](#) → Senarai Cetak Pdf

Aliran Kerja

Butiran Projek

Butiran Kontrak

Senarai Cetak Pdf

Gambar Projek

Tuntutan / CCP

Hapus Projek

Pembatalan Projek (HOPT)

History

States

Maklumbalas (3)

Kemaskini Capaian i-Supervision

Senarai Cetak Pdf Terkini Untuk Surat-Surat Yang Telah Disahkan

Perancangan



Surat Pendaftaran Projek
02-05-2018



Surat Lantik Penolong Pengurus Program
03-05-2018



Surat Lantik HOPT
09-05-2018



Q-Plan
17-07-2020



Senarai Cetak Pdf QPlan



D-Plan Cerun
04-06-2018



Senarai Cetak Pdf DPlan Cerun



Surat Brif
22-05-2018



Gerbang Nilai 1
23-05-2018



Gerbang Nilai 2
04-07-2018

Perolehan



Surat Iklan
26-06-2019



Surat Kepada Lembaga Tender
04-12-2019



Makluman keputusan Lembaga Tender
20-12-2019



Surat Setuju Terima (SST)
30-12-2019

Rekabentuk



Senarai Lengkap Lukisan Cerun
16-05-2019



Penyerahan Lukisan Lengkap Tender
21-05-2019



Makluman Penerimaan Set Lukisan Lengkap Tender
24-05-2019



Gerbang Nilai 3
26-07-2018

Pembinaan



CPlan



Senarai Cetak Pdf CPlan



Dokumen Kontrak



Rancang Kewangan Kontrak (BKIC)



Senarai Cetak Pdf Rancang Kewangan Kontrak (BKIC)

LAPORAN



| Norazura Bt Atan dari CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT (CPK)

19/01/2021 |

LOG KELUAR

LAMAN UTAMA

ALIRAN KERJA

LAPORAN

Taip di sini untuk carian

Projek

Kontrak


Kontraktor

1 Umum 2 Perancangan 3 Rekabentuk 4 Perolehan 5 Pembinaan 6 Serahan 7 Sebutharga 8 Penggunaan 9 Banjir 10 KPI 11 SekolahDaif 12 PALMS 13 Tuntutan/CCP 14 Acat 15 StrategiRmk 16 GerbangNilai 17 Perunding 18 Nsc 19 Kemaskini 20 Maklumbalas 21 Sppii


Senarai Statistik Kategori Umum

No.	a. Nama Statistik b. Mengikut Criteria
1	a. Ringkasan Laporan Projek Mengikut Peringkat Pelaksanaan (Tender) b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Lokasi Tapak , Pelanggan
2	a. Programme Performance Reporting b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , Pejabat HOPT , Lokasi Tapak , Pelanggan
3	a. Programme Performance Reporting b. Pejabat Selia Tapak , Pegawai Penguasa
4	a. Status Kewangan Projek Bagi Tahun Semasa Mengikut Bulan b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Seliatapak , Lokasi Tapak , Pelanggan , Pegawai Penguasa
5	a. Projek Mengikut Kos Projek Semasa b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Seliatapak , Lokasi Tapak , Pelanggan , Pegawai Penguasa
6	a. Status Kewangan Projek Bagi Tahun Semasa b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Lokasi Tapak , Pelanggan
7	a. Status Kos Projek Semasa Mengikut Peringkat Kitaran Projek (Tender) b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Seliatapak , Lokasi Tapak , Pelanggan , Pegawai Penguasa
8	a. Kontrak Mansuh Yang Mempunyai Jaminan Wang Pendahuluan (JWP) b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Seliatapak , Lokasi Tapak , Pelanggan , Produk
9	a. Status Projek Mansuh/Retender Mengikut Peringkat Pelaksanaan (Tender) b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Lokasi Tapak , Pelanggan
10	a. Status Projek Mansuh/Retender Mengikut Peringkat Pelaksanaan (Sebutharga) b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Lokasi Tapak , Pelanggan
11	a. Status Projek Mansuh Mengikut Tahun (Tender/Sebutharga) b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Lokasi Tapak , Pelanggan
12	a. Kontrak Mansuh Yang Mempunyai Bon Pelaksanaan b. Pengurus Program , Penolong Pengurus Program , HOPT , Seliatapak , Lokasi Tapak , Pelanggan , Produk


TUGASAN & PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB

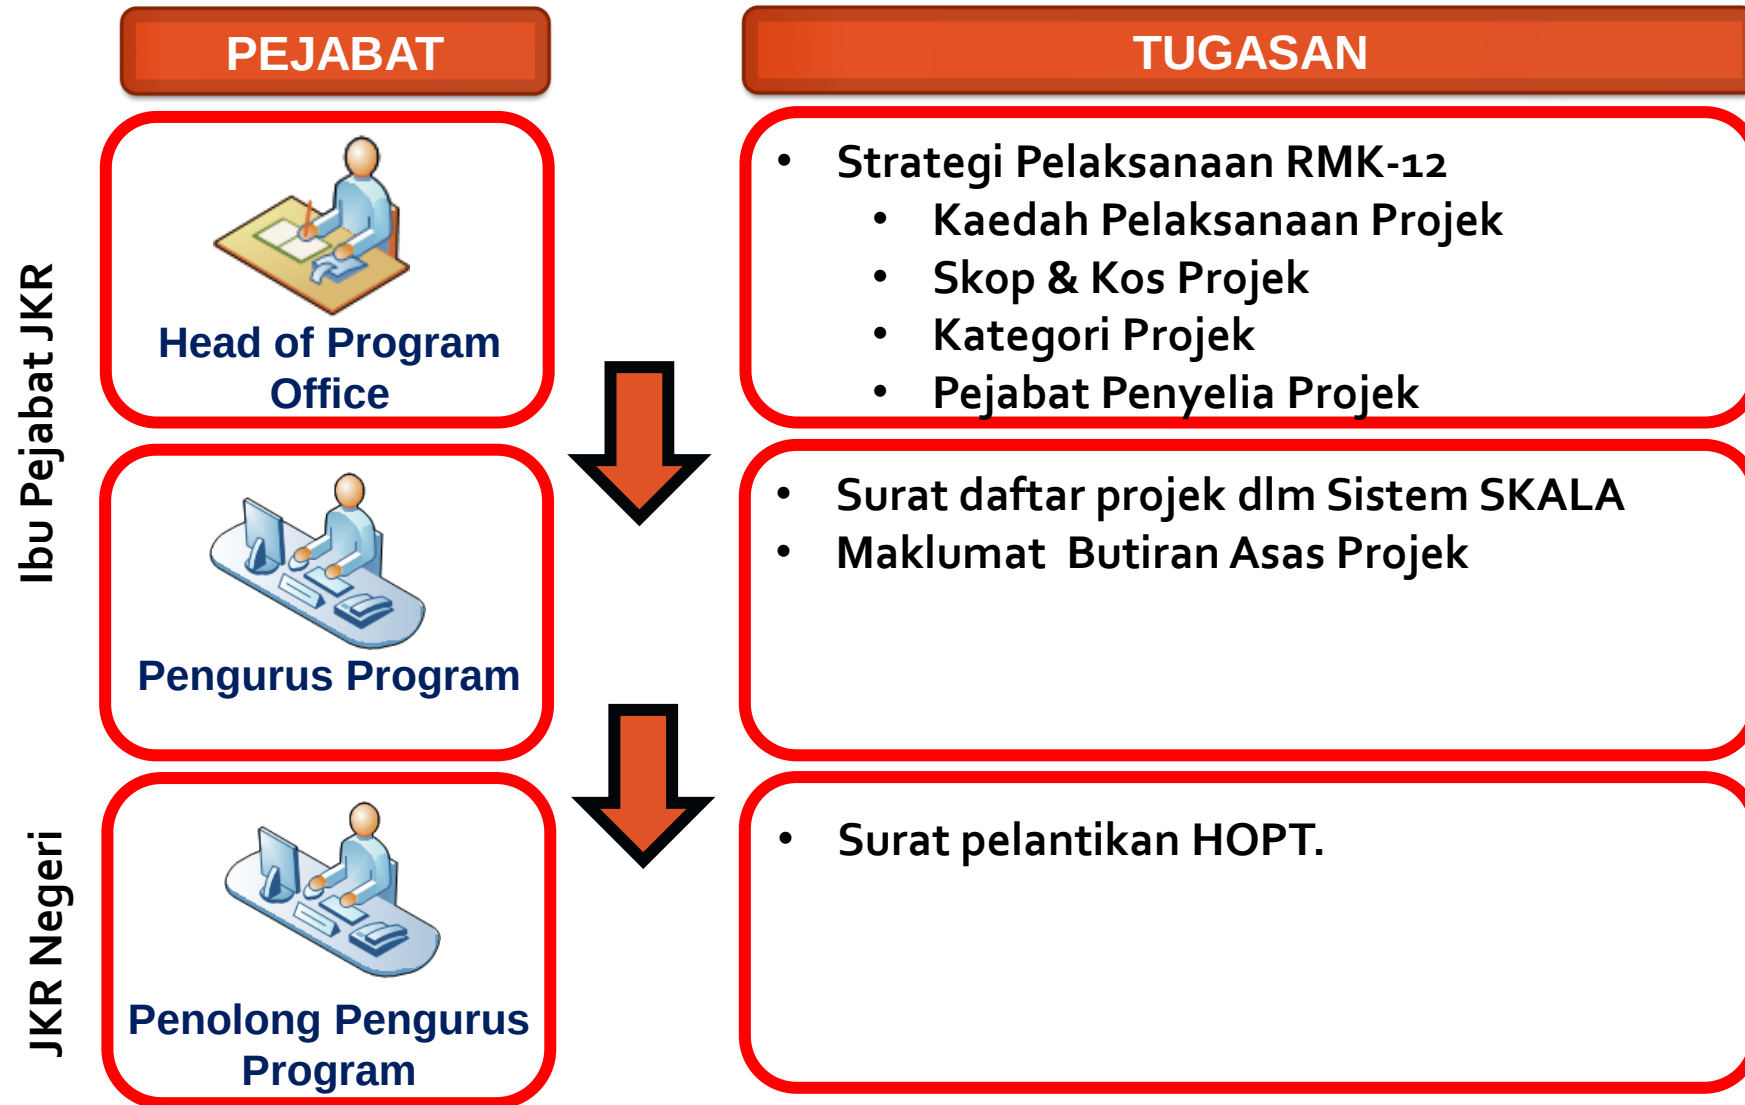


TUGASAN & PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB

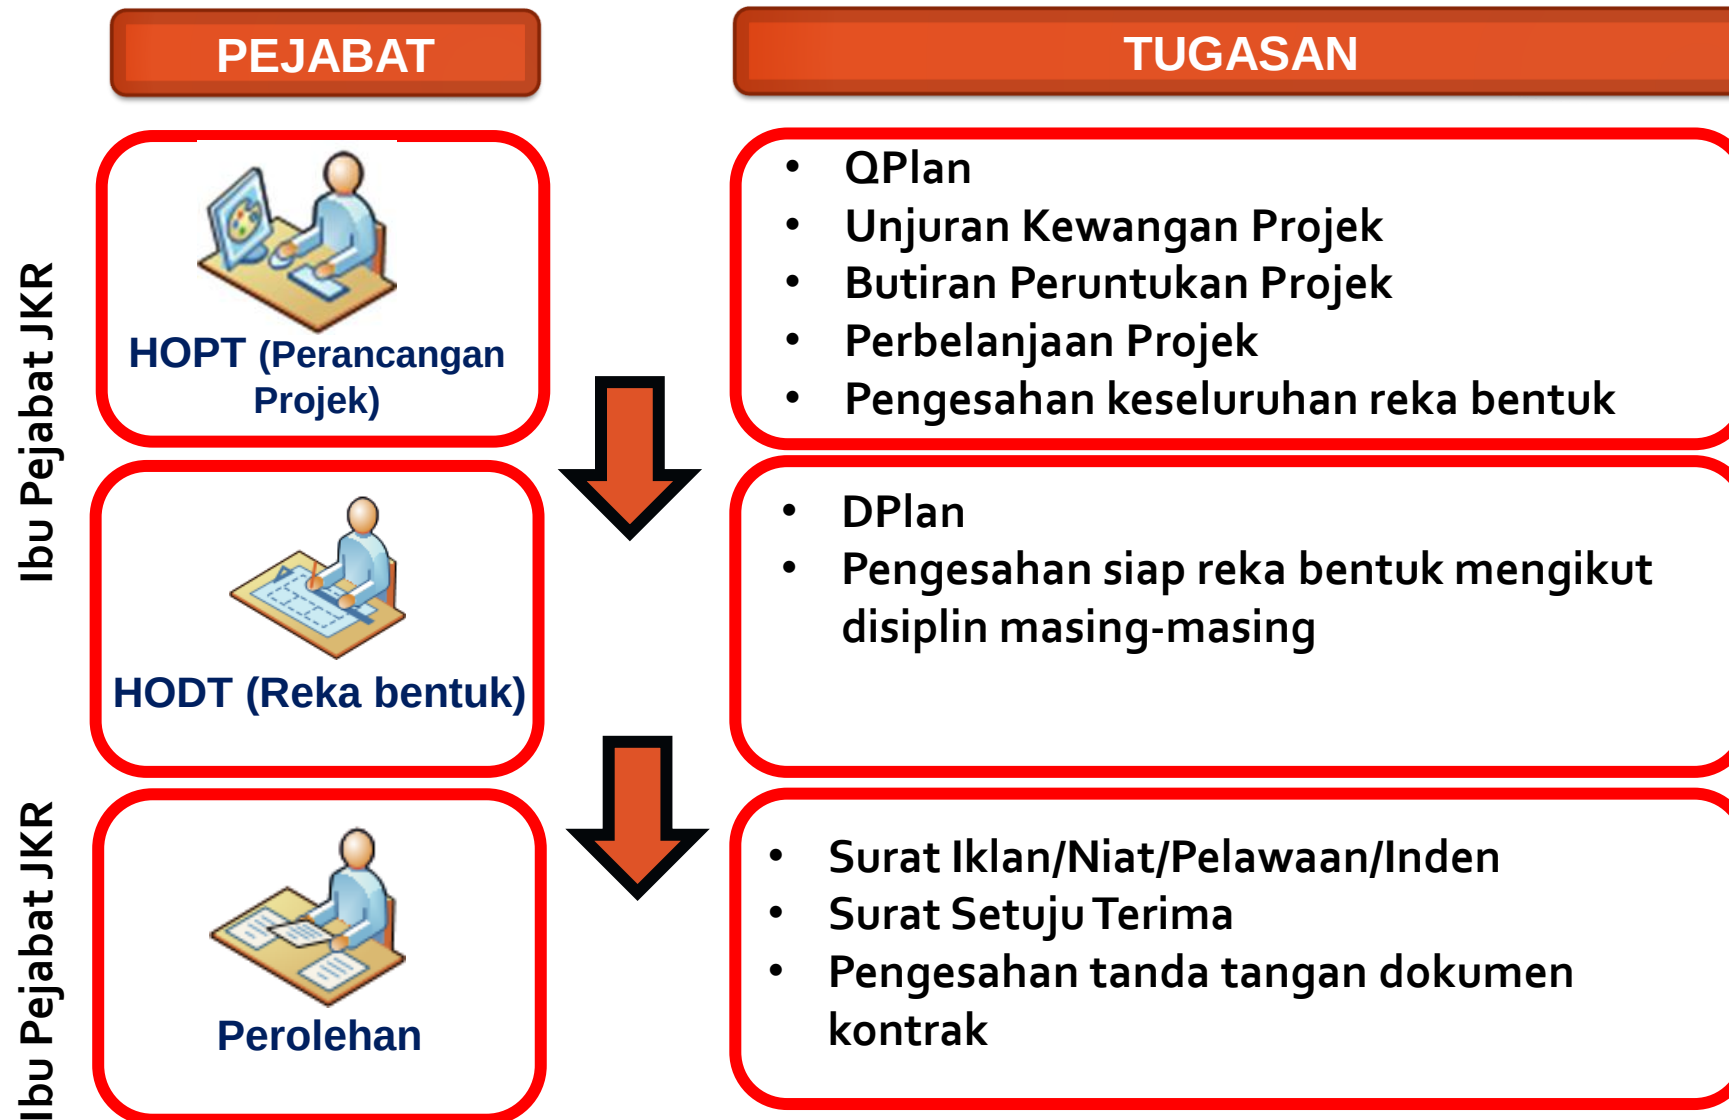

TUGASAN & PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB

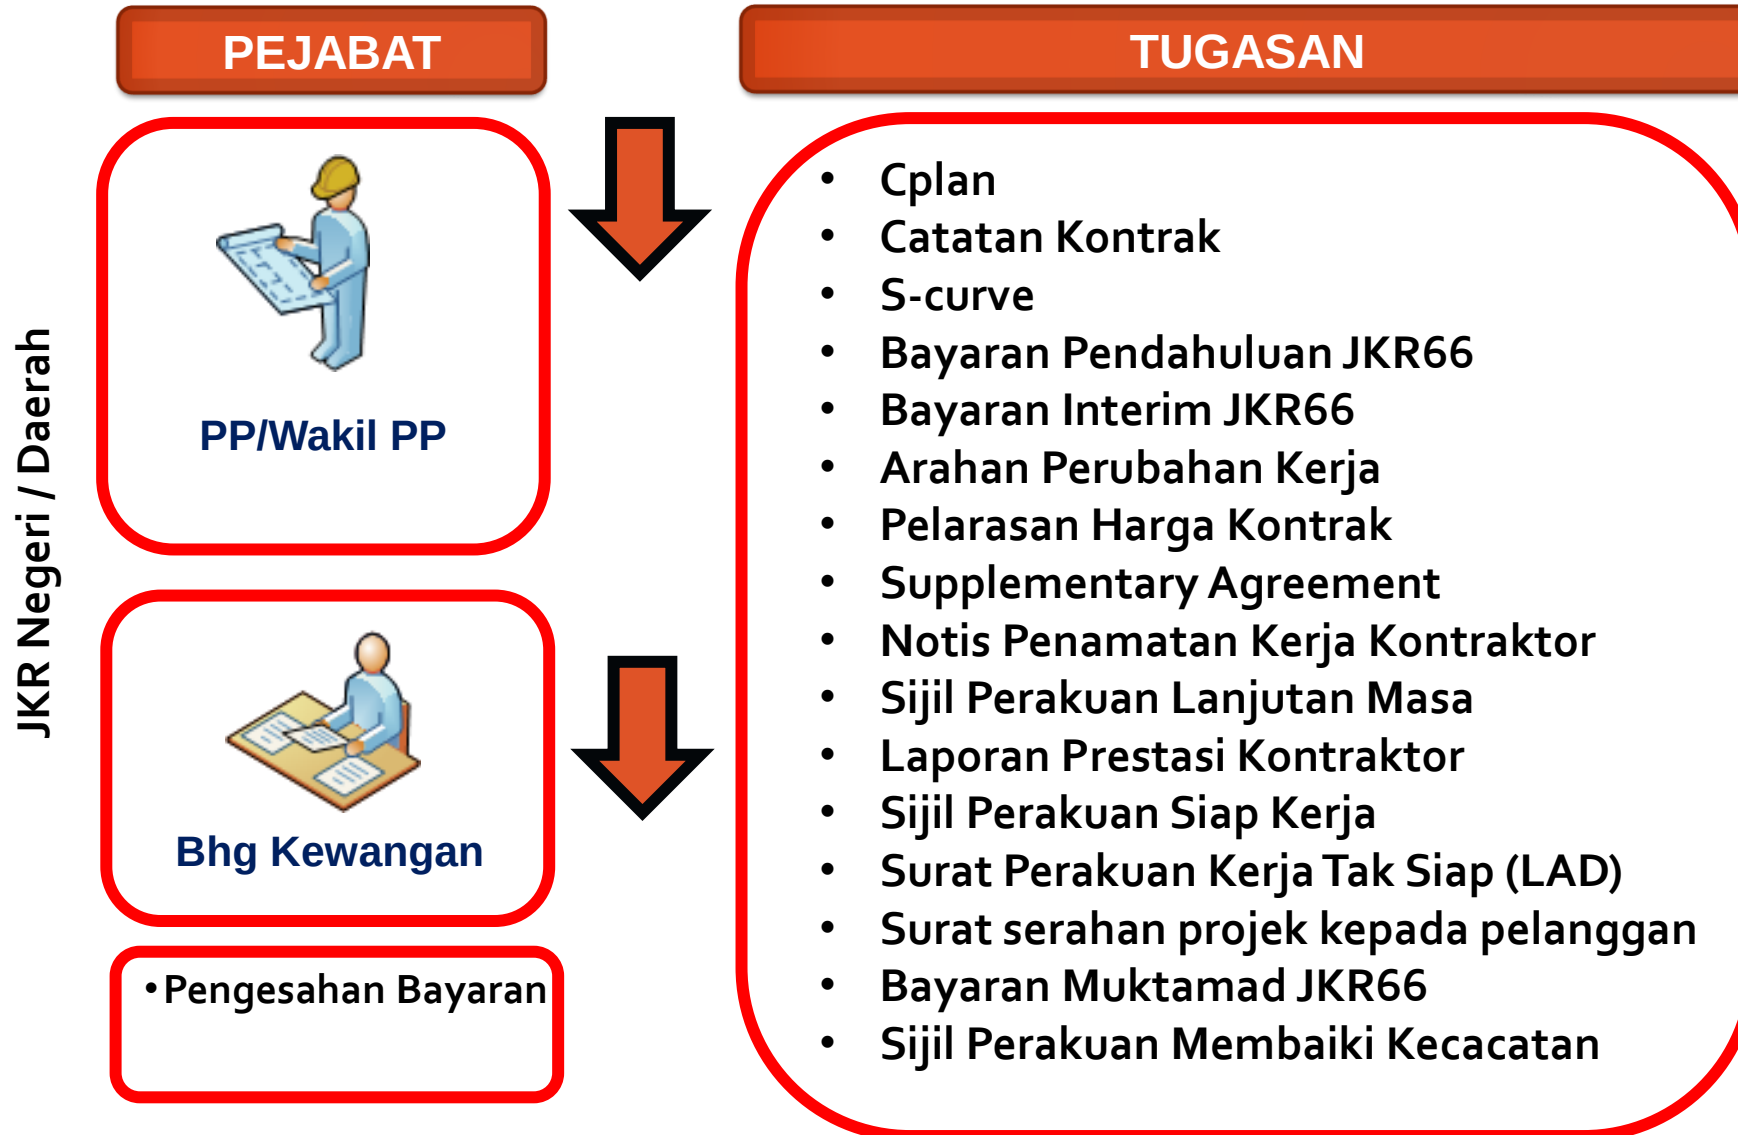

SKALA MyProject – Mobile Apps

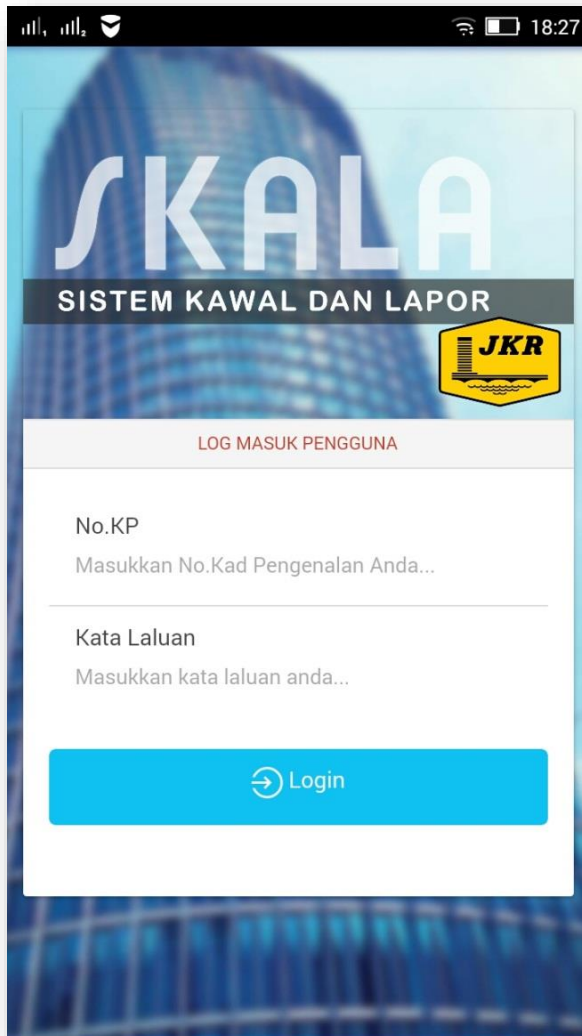

KELEBIHAN

- Pemantauan projek mudah dan boleh diakses dimana-mana.
- Fungsi carian pantas mengatasi isu kelewatan carian maklumat projek.
- Memperolehi maklumat asas untuk pelaporan segera dengan cepat dan tepat.

Info Ringkas PROJEK PERSEKUTUAN



- Keseluruhan Projek Aktif
- Lewat Siap Rekabentuk
- Lewat Iklan
- Lewat Keluar SST
- Kontrak Lewat Fizikal
- Lewat Serah
- Lewat Tutup Akaun

SKALA My Project

- **Senarai Projek (Paparan Ringkas)**
 - ✓ Pelanggan
 - ✓ Pengurus Projek
 - ✓ Kos Projek Semasa

The screenshot displays the 'Senarai Projek (1215)' screen in the SKALA My Project app. At the top, there is a search bar labeled 'Carian dalam senarai' with a magnifying glass icon. Below the search bar, three project entries are visible, each with a title in green text and three data fields: 'Pelanggan', 'Pengurus Projek', and 'Kos Projek Semasa'. The first project is 'PROJEK PEMBINAAN DEWAN DI PARLIMEN PAGOH', the second is 'PROJEK JALAN PERHUBUNGAN (KUALA BETIS-BALAR-BELATIM-BIHAI-KUALA BETIS)', and the third is 'PEMBINAAN BARU MASJID DAERAH JELEBU'. The fourth project, 'DAIF WP KUALA LUMPUR (2020)- KERJA-KERJA', is partially visible at the bottom. Each data field is represented by a grey rectangular bar. The bottom of the screen features a dark blue navigation bar with left and right arrow icons and the text '1 of 122'.

Senarai Projek (1215)

Carian dalam senarai

PROJEK PEMBINAAN DEWAN DI PARLIMEN PAGOH

Pelanggan

Pengurus Projek

Kos Projek Semasa

PROJEK JALAN PERHUBUNGAN (KUALA BETIS-BALAR-BELATIM-BIHAI-KUALA BETIS)

Pelanggan

Pengurus Projek

Kos Projek Semasa

PEMBINAAN BARU MASJID DAERAH JELEBU

Pelanggan

Pengurus Projek

Kos Projek Semasa

DAIF WP KUALA LUMPUR (2020)- KERJA-KERJA

1 of 122

SKALA My Project

- **Senarai Projek Offline**
 - ✓ Boleh dimuat turuan dan dibuka semasa offline



MUAT TURUN SKALA MyProject



SKALA MyProject

GOVERNMENT OF MALAYSIA Productivity

★★★★★ 23

3+

This app is compatible with some of your devices.


You can share this with your family. [Learn more about Family Library.](#)

Installed



DEMO - SKALA MyProject

NOTA SKALA



MENGENAI SKALA | MAKLUMBALAS

Sekiranya terdapat sebarang ulasan/pertanyaan sila hubungi : skala.jkr@1govuc.gov.my atau telefon 03-26108512 / 03-26108224 / 03-26108305
© Hakmilik 1985 - 2020 Bahagian Teknologi Maklumat, Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat, Jabatan Kerja Raya, Malaysia

Informasi yang boleh diperolehi:

- ✓ Nota
- ✓ Manual
- ✓ Garis Panduan
- ✓ Format Borang Tender/ Sebuttharga

MAKLUMBALAS SKALA

MAKLUMBALAS SKALA

Permohonan Pembetulan Data SKALA

- Semua maklumbalas berkaitan pembetulan data perlu mendapat kelulusan **Jurutera Awam Penguasa Kanan, Unit Pengurusan Prestasi Projek, Bahagian Pengurusan Projek Kompleks, CPAB, IPJKR** ditalian 03-26107104
- Pembetulan data tersebut akan diselesaikan dalam masa 3 hari bekerja dari penerimaan kelulusan dan sekiranya maklumat lengkap.


PERMOHONAN PEMBETULAN DATA SKALA



Pegawai Dari Unit SKALA BTM JKR yang boleh dihubungi:

Nama	Email	Telefon	Pegawai Bertugas Mengikut Zon
Norazura Binti Atan	norazuraatan.jkr@1govuc.gov.my	03-2610 7055	Ketua Unit SKALA, BTM JKR
Nurzahrin Bin Mohmad Barudin	nurzahrin.jkr@1govuc.gov.my	03-2610 8148	Zon 1 (CKIP, CJ, LPT2, CSFJ, CSFB, CAW. CERUN, PPKI, KEDAH, P.PINANG, KELANTAN, TERENGGANU, PAHANG, JKR UNIT KESEDAR)
Noor Sazwani Binti Ahmad Sayuti	noorsazwani.jkr@1govuc.gov.my	03-2610 8224	
Rooster Lim Yong Zhi	yzlim.jkr@1govuc.gov.my	03-2610 8261	Zon 2 (CKBA1, CKBA2, CKK, CKS, PPKB, SELANGOR, WP KUALA LUMPUR, WP PUTRAJAYA, WP LABUAN, SARAWAK)
Noor Sazwani Binti Ahmad Sayuti	noorsazwani.jkr@1govuc.gov.my	03-2610 8224	
Anis Adilah Binti Abu Talib	anisadilah.jkr@1govuc.gov.my	03-2610 8513	Zon 3 (CKP, CKM, CKE, CKUB, CAST, CA, CKAS, CKG, MELAKA, JOHOR, NEGERI SEMBILAN, PERAK, PERLIS, PPS, PGSB, SABAH)
Suria Binti Shafri	surias.jkr@1govuc.gov.my	03-2610 8203	

CARTA ORGANISASI

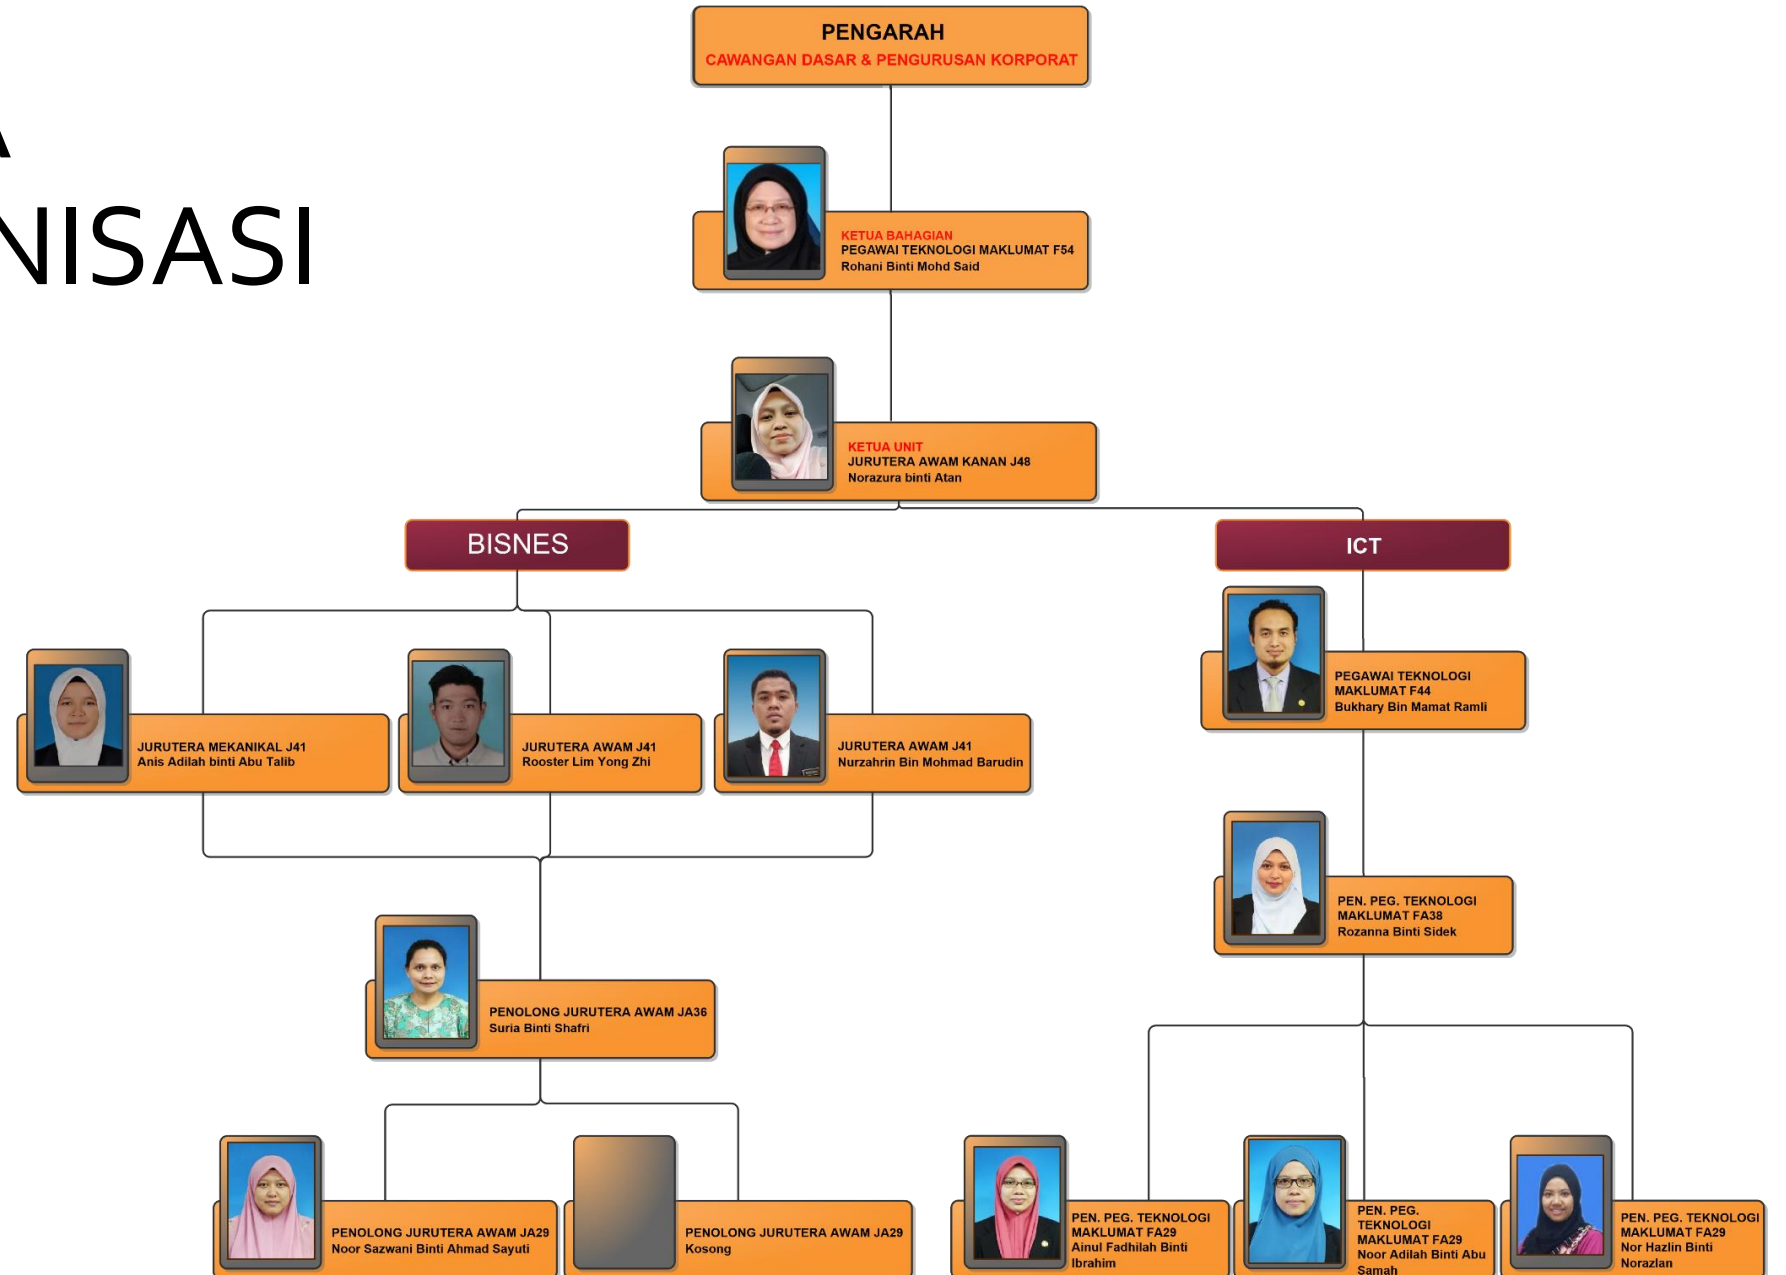

TERIMA KASIH

NORAZURA BINTI ATAN
Jurutera Awam Kanan
Unit Pengurusan Projek (SKALA)
Bahagian Teknologi Maklumat
Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat
Tingkat 14 Blok F

e-mel : norazuraatan@jkr.gov.my

Tel : 03-26107055

