

PENGURUSAN SKOP PROJEK



Kandungan

1. Definisi
2. Objektif
3. Proses Pengurusan
4. Penerangan Setiap Proses
5. Kesimpulan

Pengurusan Skop Projek

Adakah kehendak projek anda seperti ini?...



Pengurusan Skop Projek

...tetapi berkesudahan seperti ini???



Definisi Pengurusan Skop

Proses untuk memastikan semua skop kerja yang diperlukan siap dengan sempurna.




Objektif Pengurusan Skop

- Untuk menerangkan proses perancangan skop dan kandungan brif projek.
- Untuk menentusahkan skop dan mengawal perubahan skop.



Proses Pengurusan Skop

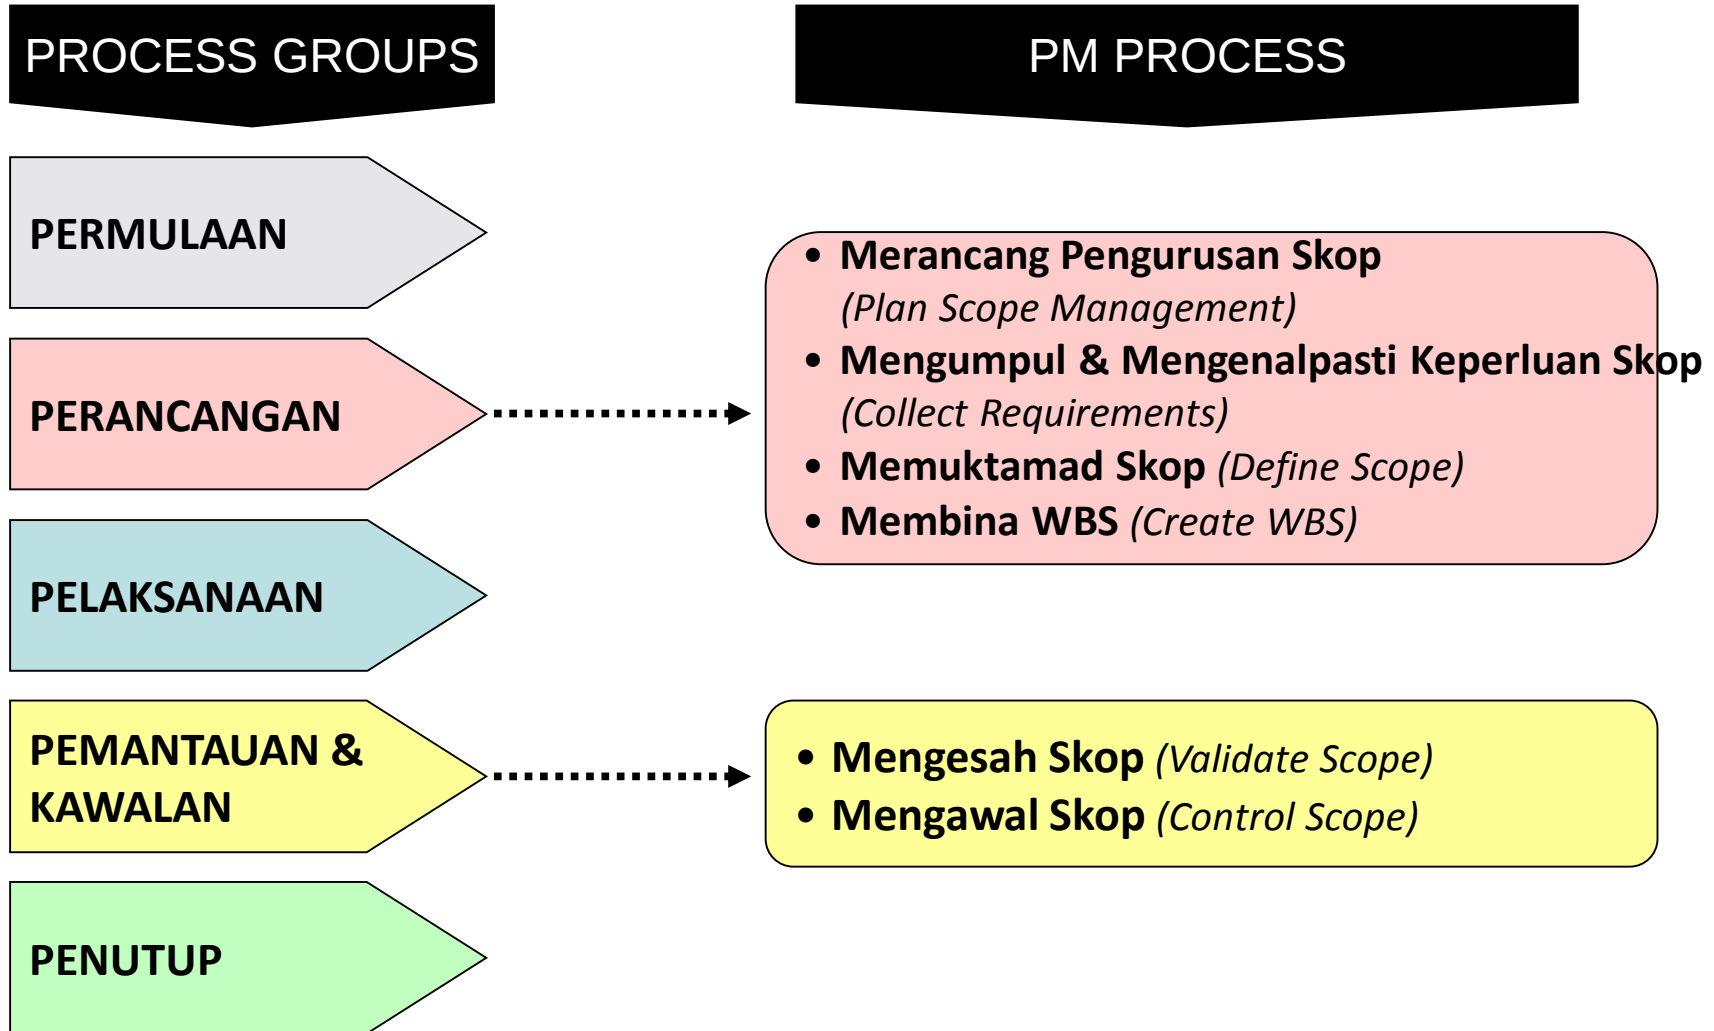

Proses Pengurusan Skop Projek

-Merancang Pengurusan Skop

- Mengenalpasti, menentukan dan mengawal perubahan skop projek.
- Mengesahkan secara bertulis semua kenyataan skop kerja

cth: brif projek yang dipersetujui bersama pelanggan

Proses Pengurusan Skop Projek

- Mengumpul & Mengenalpasti Keperluan Skop

- Mengenalpasti dan mendokumentasi keperluan *stakeholder* untuk mencapai objektif projek.
- Keperluan merangkumi keperluan skop yang boleh diukur untuk mencapai harapan pelanggan.



Proses Pengurusan Skop Projek

- Memuktamad Skop

- Kerja yang mesti dilaksanakan oleh pengurus projek bermula daripada mesyuarat bersama stakeholder utama sehinggalah ke peringkat penyerahan dan penutupan akaun akhir.




Proses Pengurusan Skop Projek

- Membina WBS (*Work Breakdown Structure*)

- WBS ialah pecahan kerja atau aktiviti bagi sesuatu projek.
- WBS merupakan asas untuk merancang penjadualan projek dari segi masa, kos dan sumber

Proses Pengurusan Skop Projek

- Mengesah Skop



- Proses dimana projek telah diterima dan dipersetujui secara rasmi oleh stakeholder untuk dilaksanakan.
- Pengesahan skop dapat mengurangkan perubahan skop dan hasil kerja dapat disiapkan seperti yang ditetapkan.

Proses Pengurusan Skop

- Mengawal Skop

- Kawalan kepada perubahan skop dan pengurusan kepada *Scope Creep*.
- Mengenalpasti skop projek secara keseluruhan dan mengesahkannya bersama *stakeholder* dapat mengelakkan berlaku *Scope Creep*.

Kesimpulan

Pengurusan Skop Projek ialah pengurusan kepada apa yang **perlu dan tidak perlu** dalam penghasilan projek.



Terima Kasih
