

LAPORAN 'LESSONS LEARNT' BAGI PROJEK :

**MEMPERELOK JALAN DARI BULATAN
SULTAN MANSUR KE KUALA BERANG,
DARI PADANG MENGKUANG KE
DURIAN GULING, TERENGGANU**

TARIKH: 18-19 JULAI 2016

**TEMPAT: KOMPLEKS KOTA DARUL NAIM
KOTA BHARU, KELANTAN**

**DISEDIAKAN OLEH: JKR DAERAH MARANG
TERENGGANU**

MAKLUMAT KONTRAK

Tarikh Milik Tapak : 23 Julai 2014

Tarikh Siap Asal : 22 Julai 2016

Kos Kontrak Asal : RM 34,657,678.50

**Pegawai Penguasa : Pengarah Kerja Raya Negeri
Terengganu**

**Perunding : ATZ Consult Sdn Bhd(C&S)
PGP Sdn Bhd (Electrical)**


Kontraktor : CT Wani Sdn Bhd

Pengenalan Projek

Projek ini dilaksanakan bagi melengkapkan jajaran jalan dari Kuala Terengganu ke Kuala Berang menjadi empat(4) lorong dua (2) hala. Apabila projek ini siap kelak maka akan sempurna laluan ini menjadi empat (4) lorong.

Antara skop kerja yang terlibat adalah melebar jalan dari dua lorong kepada empat lorong, membina jambatan baru sepanjang 56 meter, menaiktaraf persimpangan berlampu isyarat dan mewujudkan kawasan u-trun.

PELAN LOKASI TAPAK

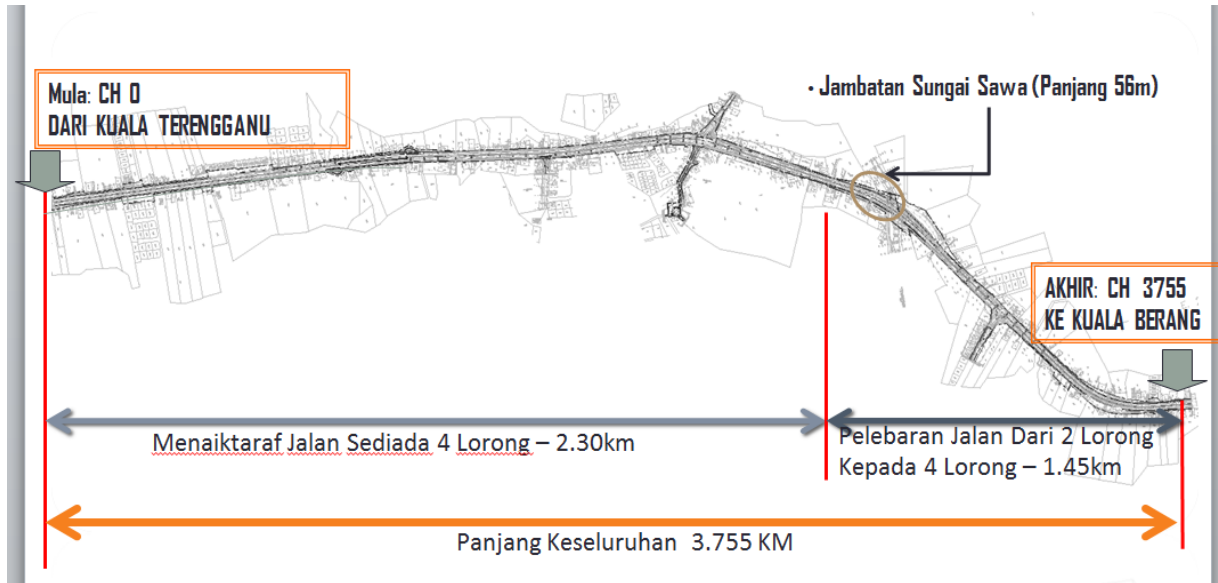

TEMPLATE TO BE USED FOR REPORT

3. EXECUTION <i>PELAKSANAAN</i>	
WHAT WENT WELL? <i>APA BERLAKU DENGAN LANCAR</i>	WHAT COULD HAVE BEEN DONE BETTER ? <i>APA BOLEH DILAKUKAN DENGAN LEBIH BAIK</i>
1. BAYARAN INTERIM DIBUAT SETIAP BULAN 2. MESYUARAT TAPAK DIBUAT PADA SETIAP BULAN 3. KERJASAMA DENGAN AGENSI YANG BERKAITAN ADALAH BAIK (JKPTG, TNB,TM DAN LAIN-LAIN) 4. KELULUSAN BAHAN DAN MOCK UP DIPEROLEHI DALAM TEMPOH YANG SINGKAT 5. TINDAKAN SEGERA DIAMBIL TERHADAP ISU YANG TIMBUL OLEH PP/WPP	1. SST DIKELUARKAN SEBELUM PROSES PBT SELESAI 2. PENYEDIAAN SENARAI KUANTITI TIDAK TERPERINCI 3. TERDAPAT PERCANGGAHAN LUKISAN PEMBINAAN (CROSS SECTION DENGAN LAYOUT) 4. KELEMAHAN PASUKAN PENYELIAAN OLEH PIHAK PERUNDING DI TAPAK 5. PAVEMENT EVALUATION DI BUAT SELEPAS SST DIKELUARKAN (SEPATUTNYA DISEDIAKAN SEBELUM TENDER DIKELUARKAN)
LESSONS LEARNT: <i>PEMBELAJARAN</i>	
1. KEPERLUAN HODT MENYEMAK SECARA TELITI LUKISAN PEMBINAAN YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK PERUNDING SUPAYA PERCANGGAHAN DAPAT DIMINIMAKAN 2. PERLANTIKAN KONTRAKTOR YANG BERPENGALAMAN DI DALAM KERJA MENAIKTARAF JALAN 3. PASUKAN PENYELIAAN PERUNDING DITAPAK PERLU DINILAI DARI SEGI PENGALAMAN KERJA YANG SESUAI UNTUK KERJA SEMASA 4. KERJA-KERJA PENGALIHAN UTILITI SEPERTI TNB,TM DAN SATU DIBUAT SECARA BERINGAN SEBELUM KERJA CIVIL DIKELUARKAN SST 5. PERLUNYA PENGASINGAN BORANG SPB BERDASARKAN KAEDAH PEROLEHAN KONVENSIONAL,KONVENSIONAL PERUNDING DAN REKA&BINA	

4. MONITORING PEMANTAUAN	
WHAT WENT WELL? APA BERLAKU DENGAN LANCAR	WHAT COULD HAVE BEEN DONE BETTER ? APA BOLEH DILAKUKAN DENGAN LEBIH BAIK
1. MAKLUMAT DALAM SISTEM SKALA SENTIASA DI KEMASKINI (APK,PHK,INTERIM) 2. KERJASAMA YANG BAIK OLEH HOPT (CAWANGAN JALAN) 3. PEMATUHAN TERHADAP PENGGUNAAN BORANG SPB 4. LAWATAN OLEH: MENTERI KERJA RAYA, DATO' SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI DAN PENGARAH ICU 5. PEMANTAUAN KUANTITI KERJA DIBUAT SECARA MINGGUAN	1. SEMAKAN LUKISAN PEMBINAAN OLEH KONTRAKTOR SEBELUM PEMBINAAN SECARA PRO AKTIF 2. RFI PERLU DISEDIAKAN SEBELUM KERJA DILAKSANAKAN 3. KEHADIRAN MESYUARAT TAPAK OLEH PIHAK HODT DAN HOPT PADA SETIAP KALI MESYUARAT DIADAKAN 4. KEPERLUAN PENGASINGAN TUGAS BERKAITAN ISU TMP,EMP & S-PLAN
LESSONS LEARNT: PEMBELAJARAN	
1. PERUNTUKAN LUAR JANGKA PERLU DIWUJUDKAN DALAM PDA 2. MEWUJUDKAN GARIS PANDUAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB SERTA SKOP YANG JELAS ANTARA JKR DAN PERUNDING 3. MEWUJUDKAN JAWATAN DALAM JKR BAGI SETIAP PROJEK SECARA BERASINGAN BAGI MEMANTAU PELAKSANAAN TMP,EMP & S-PLAN	





Kerja-kerja Pengalihan Utiliti SATU, TNB dan TM



Kerja Longkang



Kerja-kerja Pemasangan Lampu Jalan



Kerja-kerja Pemasangan Paving Block



Lawatan YB Dato' SUK Negeri Terengganu



Keratan Akhbar

42 Sinar Harian • Isnin 20 Jun 2016

MARANG

HUBUNGAN DESAAD MARANG
MOHD AZLIM ZAKRIYU • 019 836 1370 / 019 936 1236

Masalah penduduk bakal selesai

Jalan empat lorong dari Padang Mengkuang ke Durian Guling hampir siap sepenuhnya

MARANG — Penyediaan pembahagi jalan dan naik taraf jalan di Padang Mengkuang ke Durian Guling sememangnya ditunggu-tunggu penduduk yang setiap hari menggunakan laluan sarat dengan kenderaan termasuk kenderaan berat.

Sebelum ini, penduduk gelisah dan cemas kerana kenderaan meluru deras, namun jalan sepanjang kira-kira dua kilometer itu tiada pembahagi jalan, manakala di kiri kanan jalan pula terdapat banyak simpang keluar masuk.

Kini, perasaan gelisah dan cemas tidak lagi menghantui penduduk khususnya di Binjai Rendah apabila jalan empat lorong-dua lorong sebelah yang dalam proses naik taraf, hampir siap sepenuhnya.

Berita gembira itu diumumkan Ketua Umno Bahagian Marang merangkap Adun Pengkalen Berangan, A Latiff Awang pada Majlis Berbuka Puasa Bermakan 'Sentuhan kasih, Ihya Ramadan' di Dewan Sivik Wakaf Tapai, kelmarin.

A Latiff berkata, pihaknya sudah menghubungi Jabatan Kerja Raya (JKR) supaya dapat mengadakan perbincangan dengan kontraktor agar jalan empat lorong berkenaan dapat dibuka menjelang sambutan Aidilfitri tidak lama lagi.

"Buat masa ini, isu jalan yang dalam pembinaan antara Padang Mengkuang hingga Durian Guling siap sebanyak 83 peratus. Kita juga sudah menghubungi pihak JKR untuk berbincang dengan kontraktor.

"Kita mengadakan perbincangan agar jalan empat lorong itu dapat dibuka menjelang Aidilfitri tidak lama lagi," katanya pada majlis berbuka puasa anjuran Umno Bahagian Marang.

A Latiff (tiga, kanan) menyampaikan sumbangan sempena Majlis Berbuka Puasa anjuran Umno Bahagian Marang, petang kelmarin.

Marang untuk merayakan 2,000 pemimpin masyarakat," katanya.

Dalam majlis berbuka puasa itu, seramai 100 penerima dari golongan tidak berkemampuan menerima sumbangan duit raya daripada Umno Bahagian Marang dan sumbangan beras daripada Maidam.

'Terima kasih

Kelab permotoran rai anak yatim

SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN

1. EN. MOHD ALI BIN ISMAIL
PENOLONG PENGARAH KANAN, CPAB, JKR TERENGGANU
2. PN. HALIMATUN SAADIAH BINTI OTHMAN
PENOLONG PENGARAH, BHG KONTRAK & UKUR BAHAN,
JKR TERENGGANU
3. EN. NIK ABDUL HANIF BIN NIK ABDUL AZIZ
JURUTERA JALAN, JKR MARANG
4. EN. MOHD ZULKIFLI BIN MOHD SIDEK
PENOLONG JURUTERA, JKR MARANG
5. EN. MUHAMAD KHAIRUL AZMI BIN MOHAMAD
PENOLONG JURUTERA, JKR MARANG

Disediakan Oleh :

.....

Disemak Oleh :

.....

SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN


1. EN. MOHD ALI BIN ISMAIL
PENOLONG PENGARAH KANAN, CPAB, JKR TERENGGANU
2. PN. HALIMATUN SAADIAH BINTI OTHMAN
PENOLONG PENGARAH, BHG KONTRAK & UKUR BAHAN,
JKR TERENGGANU
3. EN. NIK ABDUL HANIF BIN NIK ABDUL AZIZ
JURUTERA JALAN, JKR MARANG
4. EN. MOHD ZULKIFLI BIN MOHD SIDEK
PENOLONG JURUTERA, JKR MARANG
5. EN. MUHAMAD KHAIRUL AZMI BIN MOHAMAD
PENOLONG JURUTERA, JKR MARANG

Disediakan Oleh :



.....
MUHAMAD KHAIRUL AZMI BIN MOHAMAD
Penolong Jurutera JA29
JKR Marang, Terengganu

Disemak Oleh :



.....
NIK ABDUL HANIF BIN NIK ABDUL AZIZ
Jurutera Jalan
JKR Marang, Terengganu
